

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97370 - Yucatán

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
AA829716-4EA4-8A41-8C11-FB7CDD480092018	00001000000408647348 00001000000402630111	Pago en parceladas o diferido Transferencia electrónica de fondos	20/12/2018 13:08:27 20/12/2018 13:11:15	A-325 Ingreso

RECEPTOR	
R.F.C.: MOY8501019K3	USO CFDI: Construcciones
NOMBRE: MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN	
DIRECCIÓN: 53 X 48 Y 50 PALACIO MUNICIPAL S/N, OXKUTZCAB, OXKUTZCAB, Yucatán, México C.P. 97880	

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
0B001	1	SERVICIO	72111001 - POR CONCEPTO DE PAGO DEL MONTO TOTAL POR LA CANTIDAD DE \$877,391.64 (SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.) DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚMERO FISMDF-OKX-YUC-2018/P2-IR/10 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2018.		Exento	\$ 877,391.64	\$ 0.00	\$ 877,391.64
SUBTOTAL							\$	877,391.64
IVA							\$	Exento
TOTAL							\$	877,391.64

AVISO DE PRIVACIDAD

IMPORTE CON LETRAS
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
11_1AA829716-4EA4-8A41-8C11-FB7CDD480092018-12-20T13:11:15:SAD110722MQA1NkmM76M/EyvZ5d2i8r0NAmrk+ZVDA8rX9c486CDn7Q0N4gzmi+TPH0Mg/WG0H
4bRj1gRLZu0reL0LpnU9j9rT5uKDLFcACWt05swF7A/NKz0OrdYkFMHOn0hyKKEKDbx5RUvuk88EcaXv8ntkZpg1cD9HobFBzHu6bmokL0JXWSm48JqMNB/CGRm5x
cwwBhUjpmEjVDbKkC/Va0pV12GOpAPRnL8Hq4DcRC7JO8qS+eCLB43uQVjV5Wp8cX0De2sYkcRdewJ5K0GH1UV99mz/w4uCZB8JUJgnUjFZIX443KAUBcT05FPQ==00
001000000402630111



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
NkmM76M/EyvZ5d2i8r0NAmrk+ZVDA8rX9c486CDn7Q0N4gzmi+TPH0Mg/WG0HueRj1gRLZu0reL0LpnU9j9rT5uKDLFcACWt05swF7A
/NKz0OrdYkFMHOn0hyKKEKDbx5RUvuk88EcaXv8ntkZpg1cD9HobFBzHu6bmokL0JXWSm48JqMNB/CGRm5xoswwBhUjpmEjVDbKk
C/Va0pV12GOpAPRnL8Hq4DcRC7JO8qS+eCLB43uQVjV5Wp8cX0De2sYkcRdewJ5K0GH1UV99mz/w4uCZB8JUJgnUjFZIX443KAUBc
T05FPQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
v69SNKQ3NEe632jQ5glD8cxGDdGjh7M05cCEk8X0cGcZEKjXTxZgTA9ruJDeevH48bHY1Yzlu0wzJOTU3CIZmEBHpbmXQIF3CoQbKZF
rIMj995mkGv6SAMC09aZcPPCduhU0DE4xQeYyoc2P8P4Mq6cSgKB1A2cmUCv9sq#ZYQrE9hncqHOSxNEMMGwzUJ0h0H0U20scM3bl
NAHFSzK50eaOnDHVC/nudM99Y3GK2x1v+MX5w6M+yzgXUUTysfTngUYCPa+03G3FG7RMNPSodE+ba7nl0YnX8OMgBklyz08AsgdWwZ
Farrhmcslg==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
SAD110722MQA

RECIBI

REVISO

AUTORIZO



C. JOSE REMIGIO DZUL DZUL
REPRESENTANTE LEGAL

ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATÁN
EL AYUNTAMIENTO 2018-2021

**H. AYUNTAMIENTO DE OXKUTECAB
CONTROL FINANCIERO**

CONTRATO: FISMDF-OKK-YUC-2018-92-IR/10

ESTIMACIÓN: 01

OBRA: CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO

FECHA DE ESTIMACIÓN: 31-ene-2019

LOCALIDAD: OXKUTECAB

PERIODO: 12-dic-2018

AL: 30-ene-2019

MUNICIPIO: OXKUTECAB

CONTRATISTA:

I M P O R T E S	L I Q U I D A C I O N (\$)	
VALOR DE LA ESTIMACIÓN	8877,391.64	
0.00% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	00.00	
SUBTOTAL	8877,391.64	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	00.00	
SUBTOTAL DEL VALOR DE LA ESTIMACIÓN	8877,391.64	
RETENCIONES:		
0.00% I.C.I.C.:	00.00	
0.00% DERECHO Y SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL:	00.00	
0.00% OBRAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL:	00.00	
SUBTOTAL RETENCIONES:	00.00	
ALCANCE LIQUIDO DE LA ESTIMACIÓN	8877,391.64	

A N T I C I P O	S/IVA	C/IVA
IMPORTE ANTICIPO	00.00	00.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO ANTERIOR	00.00	00.00
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	00.00	00.00
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	00.00	00.00
SALDO POR AMORTIZAR	00.00	00.00

ESTADO DE CUENTA + CONVENIO	S/IVA	C/IVA
IMPORTE ACTUAL CONTRATADO	8877,391.64	8877,391.64
ACUMULADO ANTERIOR	00.00	00.00
ESTA ESTIMACIÓN	8877,391.64	8877,391.64
ACUMULADO A LA FECHA	8877,391.64	8877,391.64
SALDO POR EJECUC	00.00	00.00

ATENTAMENTE

PROCTORA CASER, S.A. DE C.V.
C. JOSE REMIGIO DEUL DEUL

AUTORIZADO

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTECAB, YUCATÁN
EL AYUNTAMIENTO 2018-2021

Vo. Ho.

ING. FELLIERTO VARGUES CASNER
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB

ESTADO DE CUENTA HASTA LA ESTIMACIÓN NO. 01

PROGRAMA : FISMDF 2018
CONTRATISTA : PROMOTORA CASSA, S.A. DE C.V.
LOCALIDAD : OXKUTZCAB
CONTRATO : FISMDF-OKK-YUC-2018-92-18/10
FECHA : 12-dic-2018
MUNICIPIO : OXKUTZCAB
FECHA DE INICIO : 12-dic-2018
TERMINACIÓN : 30-ene-2019
OBRA : CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO
CONT. (I/IVA) : \$877,391.64 AMPLIACIÓN : 20.00 ANTICIPO : 80.00

ESTADO DE CUENTA
HASTA LA ESTIMACIÓN NO. 01

FECHA : 31-ene-2019

IMPORTE DEL CONTRATO :	\$877,391.64
IMPORTE DE ESTIMACIONES ANTERIORES :	\$0.00
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN :	\$877,391.64
SALDO	\$0.00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO :	
IMPORTE DEL ANTICIPO :	\$0.00
AMORTIZADO ESTIMACIONES ANTERIORES :	\$0.00
AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN :	\$0.00
SALDO	\$0.00

ATENTAMENTE

PROMOTORA CASSA, S.A. DE C.V.
C. JOSE BENICIO DEUL DEUL

AUTORIZO

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB YUCATAN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Vc. Sa.

ING. FILIBERTO MARGUES CANCHE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE OKKUTZCAB

ESTIMACIÓN

HOJA 1 DE 8

Estimación No. : 01	FECHA : 31-mar-2019	DEL : 12-dic-2018	AL : 30-mar-2019	IMPORTE : 877,391.84
PROGRAMA : FIDOP 2018				
CONTRATISTA : PROMOTORA CARBA, S.A. DE C.V.				
LOCALIDAD : OKKUTZCAB				
MUNICIPIO : OKKUTZCAB				
CONTRATO : FIDOP-OMF-VOC-2018-09-18/10				
FECHA DE INICIO : 12-dic-2018				
TERMINACIÓN : 30-mar-2019				
OBRA : CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO				

CLAVE	CONCEPTO	FTE	UMI	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO	ACUM.ANT.	VOLUMEN		IMPORTE ESTIMADO
							PRESENTE	ACUM.TOTAL	
0001	TRABAJOS PRELIMINARES.								
5A030003	LETREDO DE 27 X 18 CMS A BASE DE LANTANA CAL. 20 CON LA LETRADA EN MATERIAL ADHESIVO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA. INCLUYE PLAZAS DE FIJACION LIMPIEZA DE TERRENO. INCLUYE: CHAPFO DE MALTEA, RECOLECCION DE BASURA, ACARRIO A PIR DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (SEGUN INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA).		P2A	158.40	13.00	0.00	13.00	0.00	2,059.20
5A030050	TRABO Y NIVELACION A EJES DE DESPLANTE DE EDIFICIO. POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA, LOCALIZACION GENERAL, LOCALIZACION ENTE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOQUERIAS, REFERENCIAS, LIMPIEZA, ACARRIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DESPRECIOS Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		M3.	2.91	208.00	0.00	208.00	0.00	605.28
5A300001	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO BOCA, EN SECO O EN AGUA, CON CUALQUIER MAQUINARIA O A MANO A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: ACCESOS FUERA DE LA OBRA.		M3.	9.88	268.00	0.00	268.00	0.00	2,655.04
0002	CIMENTACION				76.96	0.00	76.96	0.00	17,846.20
					TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES.				22,585.78

Autorizó:  Elaboró:  Revisó: 
 TEC. SAUL ANTONIO GONZALEZ C. JOSE BENITO DEHL DIZAL **ING. FELIPE VASQUEZ CANOBE**
 PRESIDENTE MUNICIPAL ADMINISTRADORES UNICO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

 PRESIDENTE MUNICIPAL
 RALLANTZAC HONORO CHEL
 OKKUTZCAB YUCATAN
 EL AYUNTAMIENTO 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE OKKUTZCAB

ESTIMACIÓN

HOJA 2 DE 8

Estimación No. : 01	FECHA : 31-ene-2019	DEL : 13-dic-2018	AL : 30-ene-2019	IMPORTE :	877,322.64
PROGRAMA : FIANDEF 2018					
CONTRATISTA : PROMOTORA CARRA, S.A. DE C.V.					
LOCALIDAD : OKKUTZCAB					
MUNICIPIO : GRATECAR					
OBRA : CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO					
CONTRATO : FIANDEF-OKK-100-2018-P2-1H/10			FECHA :	11-dic-2018	
FECHA DE INICIO :			12-dic-2018	TERMINACIÓN : 30-ene-2019	

CLAVE	CONCEPTO	FTE	IDEI	PRECIO UNITARIO	VOLUMEN			IMPORTE ESTIMADO
					PRECIADO	ACUM. ANT.	ACUM. TOTAL	
58610001	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 10 CMS., DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO (C:C:P) 1:5:20 ENTERRADO A 1 VISTA.	M3.	1,517.67	53.04	0.00	53.04	0.00	80,487.22
50606004	CAJENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE SECTOR REFORZADA CON ARMEX 15X15/4, INC. CIMBRA COMUN A DOS CAMAS.	ML.	209.66	200.20	0.00	200.20	0.00	41,973.93
50620503	IMPRESIONABILIZACION DE CAJENA DE CIMENTACION HASTA 35 CMS DE ANCHO CON MICROLASTIC, INC. LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	ML.	12.87	200.20	0.00	200.20	0.00	2,576.53
54020200	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES DE CASAS DE 20 CMS, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, INC. ACABADOS LIBRES DEL MATERIAL DESDE CUALQUIER LUGAR DE LA OBRA.	M3.	105.78	53.33	0.00	53.33	0.00	5,640.82
54102002	SOMBRISTINO Y BELLESO DE MATERIAL INERTE (BISCOMBO NEGRO) COMPACTADO (CON PISON DE MANO Y AGUA EN CALDAS DE 20 CMS DE ESP. INC. ACABADO DEBIDO DE LA OBRA, MEDIO COMPACTO.	M3.	442.96	17.80	0.00	17.80	0.00	7,883.36
5A308003	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, DE 30X30 CMS. DE SECTOR REFORZADO CON ARMEX 15-15/4, INC. CIMBRA COMUN, HABILITADO, COCADO Y VIBRADO.	ML.	476.53	36.40	0.00	36.40	0.00	17,327.13
0003	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS					TOTAL CIMENTACION		155,958.98

 Elaboré	 Revisó
TSC. SAUL ANTONIO GARCIA DE PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. FILIBERTO VALDES CAMORE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE OKXUTZCAB

ESTIMACIÓN

HOJA 3 DE 8

Estimación No. : 01	FECHA : 31-ene-2019	DEL : 13-dic-2018	AL : 30-ene-2019	IMPORTE : 877,391.64
PROGRAMA : FIRMIPO 2019				
LOCALIDAD : OKXUTZCAB				
MUNICIPIO : OKXUTZCAB				
CONTRATISTA : PROMOTORA CASSA, S.A. DE C.V.				
CONTRATO : FIRMPO-CHE-VUC-2018-03-DE/IS				
FECHA DE EMICIO : 19-dic-2018				
FECHA DE TERMINACIÓN : 30-ene-2019				
OBRA : CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DISTRIBUIDORIO				

CLAVE	CONCEPTO	FTE	UML	PRECIO UNITARIO	VOLUMEN			IMPORTE ESTIMADO	
					PROYECTADO	ACUM. ANT.	PRESENTE		
					ACUM. TOTAL	EXCEDENTE			
54080103	MORO DE BLOQUE HURCO DE CONCRETO, TIPO INTERMEDIO CON RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESION DE 40 KG/CMG (3000 PSI), DE 15X20X40 (3 HURCOS), ACABADO COMO A CUALQUIER NIVEL, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO EN PROPORCION 1:2.7. ESPECIE: PLANTEL A OBRA, ACABADO HASTA EL LÍMITE DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACION A CUALQUIER NIVEL. CORTES, AJUSTES, ELABORACION DEL MORTERO, RECORTE DEL MORTERO EN LAS JUNTAS AL RAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESALTES PURMA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, MANSO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUINO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		MO.	268.47	404.40	0.00	404.40	0.00	108,570.34
54087010	ANCLAJE DE CASTILLO ANDRUGO EN CADENAS O CONTRAQUE DE CEMENTACION A BASE DE UNA VARILLA DE 3/8", AMARRADA CON ALAMBRE RECOCIDO AL ACERO, INCLUYE: SECCIONA DE 30 CMG DE LONGITUD Y 0.60 MTS DE DESARROLLO PARA TRASLAFE, HABILITADO DEL ACERO, CORTES, AMARRAS, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANSO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		ML.	66.90	39.00	0.00	39.00	0.00	2,609.10
50910007	CASTILLO ANDRUGO DE CONCRETO F'c=200 KG/CMG EN UN AGUJERO DE BLOQUE DE 15X20X40 CMG. REFORZADO CON UNA VARILLA DEL No. 3 INC. HABILITADO Y COLADO		ML.	104.28	85.80	0.00	85.80	0.00	8,947.22
50920112	CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO F'c=200 KG/CMG DE 15X20 CMG. DE SECCION REF. CON ARMEX 15-20-4 INC. CIERRA COMO, HABILITADO Y COLADO.		ML.	278.41	41.60	0.00	41.60	0.00	11,583.66

Autorizó:  Elaboró:  Revisó: 

TIC. PAUL ANTONIO ROMERO C. C. JOSE RENEGO DEOL DEUL ING. FILIBERTO VAQUERO CANCHE

PRESIDENTE MUNICIPAL ADMINISTRADOR UNICO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE OKKUTZCAB

ESTIMACIÓN

HOJA 4 DE 8

Estimación No.: 01 FECHA: 31-ene-2019 DEL: 12-dic-2018 AL: 30-ene-2019 IMPORTE: 877,381.64

PROGRAMA: FISINF 2018

LOCALIDAD: OKKUTZCAB

MUNICIPIO: OKKUTZCAB

CONTRATO: FISINF-00E-YUC-2018-P2-JE/10

FECHA DE INICIO: 12-dic-2018

FECHA DE INICIO: 12-dic-2018

TERMINACIÓN: 30-ene-2019

TERMINACIÓN: 30-ene-2019

OBRA: CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO

CLAVE	CONCEPTO	FTE	CNS	PRECIO UNITARIO	VOLUMEN			IMPORTE ESTIMADO
					PREPROYECTO	ACTM.AUT.	ACTM.TOTAL	
50666007	CASTILLO DE CONCRETO P'Q-200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. DE SECCION, REFORZADO CON ARMEX 15-15-4. INC. CIMBRA COMEN, HABILITADO Y COLADO.		ML.	209.04	119.60	0.00	119.60	25,005.97
50666114	CARRERA DE NIVELACION DE CONCRETO F'Q-200 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION. REFORZADA CON ARMEX 15-4. INC. CIMBRA COMEN A DOS CARAS.		ML.	120.89	200.20	0.00	200.20	24,232.18
50610211	CARRERA DE CONCRETO P'Q-150 KG/CM2 DE 15X10 CMS. EN ANTERECHO DE VENTANA SOBRE MURO DE BLOCK, REFORZADO CON ARMEX 15-4. INC. CIMBRA COMEN, COLADO Y DESCIMBRADO.		ML.	103.10	20.80	0.00	20.80	2,144.48
TOTAL MUROS, CARRERAS Y CASTILLOS								183,061.15
0004	LOSA Y ACABADOS DE AZOTEA							
50404008	LOSA DE VIGUETA 15-5 Y BORDILLA DE 15X25X54 CMS, A CUALQUIER NIVEL, CONCRETO F'Q-200 KG/CM2, A CUALQUIER ALTURA, CON 3 CMS DE CAPA DE COMPRESION. INCLUYE: MALLA ELECTRODINADA 6X6-10/10, HABILITADO DE LOSA, ELEVACION DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, AFUNTALAMIENTO, ARMADILANTE, FRONTERAS, BASTONES, ACOMODO, COLADO, VIRBADO, DESCIMBRADO, CURADO, ECTICO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION.			908.05	208.00	0.00	208.00	188,999.30
50404002	ACABADO DE AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR PROYECTADO, DE 3.01 A 6.00 M DE ALTURA, INCLUYE: DERRETIDO CON MORTERO (OS:PI) 1:2.5, ENTUBADO CON MORTERO (OS:CI:PI) 1:4:12, ACABADO FINAL DE ESTUPO FIBRO CON MORTERO (OS:CI:PCI) 1:1:8.9		M2.	214.98	177.87	0.00	177.87	38,259.99




Presidente Municipal
 MUEL ANTONIO ROMERO CHEL
 CAJUTZ'AB, H.C. 27
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Director de Obras Publicas
 WILFREDO VARGAS CANCHE
 190, FILIBERTO VARGAS CANCHE
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Autorizado:  Revisó: 

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
 ADMINISTRADOR UNICO
 C. JOSE BENITO DEUL DZUL
 190, FILIBERTO VARGAS CANCHE


PROMOTORA CASSA, S.A. DE C.V.
 CALLE 36-D No. 477 INT. 1 ENTRE 47-A Y 49, COL. LAS BRISAS DEL NORTE, C.P. 97144, MERIDA,
 YUCATAN

RFC: PCA-090929-Q17

NÚMEROS GENERADORES

CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO
 DE OXKUTZ'CAN, YUCATAN.
 L.I.C. No. P15MDP-0XK-YUC-2018/P2-IR/10 FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2018
 Periodo : DEL 12/dic/2018 AL 30/ene/2019

Ent.	Lugar	Eje	Tramo	Largo	Ancho	Alto	Peso	Piezas	Volumen	Observaciones
0001		TRABAJOS PRELIMINARES.								
SA010005		LEVANTO DE 37 X 18 CMS A BASE DE LARIBA CAL. 20 CON LA LEYENDA EN MATERIAL ADMISIBLE DEL PROGRAMA DE VIVIENDA, ENTORRE PEJAS DE FUNDACION								
	Frete						Total Frente	13	13.0000	CUARTOS 1 AL 13
							Total Concepto	SA010005	13.0000	PA
SA020000		LIMITIZA DE TERRENO. INCLUYE: CUARPO DE MALEZA, RECTIFICACION DE MARGEN, ACARREO A PIE DE TIRO, MARGO DE ORRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SEGUN INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA.								
	Frete	A-B	1-2	4.00	4.00		Total Frente	13	208.0000	CUARTOS 1 AL 13
							Total Concepto	SA020000	208.0000	M2.
SA030050		TRAZO Y REVELACION A EJES DE DESPLANTE DE EDIFICIO, POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MANUALES Y MANO DE OERA QUE INTERVIENAN, LOCALIZACION GENERAL, LOCALIZACION ENTRE EJES, SERRELANTEJOS, SOTACADO, BARRIOS DE RIVES, MOJONERAS, REFERENCIAS, LIMPIEZA, ACARREO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
	Frete	A-B	1-2	4.00	4.00		Total Frente	13	208.0000	CUARTOS 1 AL 13
							Total Concepto	SA030050	208.0000	M2.
SA030101		EXCAVACION EN CALAJOTER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN GRUO 0 EN AGUA, CON CUNAJOTES MANUTARIA O A MANO A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA.								
	Frete	A	1-2	4.00	0.50	0.80	Total Frente	13	20.8000	CUARTOS 1 AL 13
		B	1-2	4.00	0.50	0.80	Total Frente	13	20.8000	CUARTOS 1 AL 13
		1	A-B	3.40	0.50	0.80	Total Frente	13	17.6800	CUARTOS 1 AL 13
		2	A-B	3.40	0.50	0.80	Total Frente	13	17.6800	CUARTOS 1 AL 13
							Total Concepto	SA201001	76.9600	M3.
							Total Concepto	SA201001	76.9600	M3.



 Ing. FILIBERTO VASQUEZ CANCHE
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



 Ing. JOSE EMILIO USUL DEUL
 ADMINISTRADOR UNICO

SECRETARÍA MUNICIPAL
 PAUL ARTURO ROSARIO OUEL
 CLAYTON VILLALBA
 ELABORADO EL 25/12/18

PROMOTORA CARRA, S.A. DE C.V.
 CALLE 36-D No. 477 INT. 1 ENTRE 47-A Y 49, COL. LAS BRISAS DEL NORTE, C.P. 97144, MERIDA,
 YUCATÁN
 RFC: PCA-090929-Q17

NÚMEROS GENERADORES

CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO
 DE OKKUTZ'KAB, YUCATÁN.

LIC. No. FISMDF-0XK-YUC-2018/F2-1K/10
 Fecha: 10 DE DICIEMBRE DE 2018
 Periodo: 01 DE 12/dic/2018 AL 30/ene/2019

Est.	Lugar	Eje	Tramo	Largo	Ancho	Alto	Peso	Piezaa	Volumen	Observaciones
0002	CIMENTACION									
58010001	CINTADO Y DESPLANTE DE MAMPONERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 30 CMS., DE ESPESOR, ASERTADO CON MORTERO (O.C.P) 1:5:10 ENTERRANDO A 1 VISTA.									
	Fronte	A	1-2	3.40	0.30	1		13	13.2400	CUARTOS 1 AL 13
		B	1-2	3.40	0.30	1		13	13.2400	CUARTOS 1 AL 13
		1	A-B	3.40	0.30	1		13	13.2400	CUARTOS 1 AL 13
		2	A-B	3.40	0.30	1		13	13.2400	CUARTOS 1 AL 13
		Total Frente							53.9400	M3.
		Total Concepto					58010001		53.9400	M3.
50495004	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 15X15 CM DE SECCION REFORZADA CON ARMEX 10X13/4, INC. CINTIRA COMEN A DCS CARRAS.									
	Fronte	A	1-2	4.00				13	52.0000	CUARTOS 1 AL 13
		B	1-2	4.00				13	52.0000	CUARTOS 1 AL 13
		1	A-B	3.70				13	48.1000	COMARTOS 1 AL 13
		2	A-B	3.70				13	48.1000	COMARTOS 1 AL 13
		Total Frente							200.2000	M3.
		Total Concepto					58060004		200.2000	M3.
50020503	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION HASTA 35 CMS DE ANCHO CON MICROLASTO INC. LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.									
	Fronte	A	1-2	4.00				13	52.0000	CUARTOS 1 AL 13
		B	1-2	4.00				13	52.0000	CUARTOS 1 AL 13
		1	A-B	3.70				13	48.1000	CUARTOS 1 AL 13
		2	A-B	3.70				13	48.1000	CUARTOS 1 AL 13
		Total Frente							200.2000	M3.
		Total Concepto					50020503		200.2000	M3.

Autorella:  Elaboró:  Revisó: 
 TEC. RAUL ANTONIO ESCOBAR C. JOSE RIBALTO DE LA DEUL 100 FILIBERTO VARGUES CANOPE
 PRESIDENTE MUNICIPAL ADMINISTRADOR DEICO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE MUNICIPAL
 RAUL ANTONIO ESCOBAR CEB
 CONCEJAL MUNICIPAL
 EL AVANCE DEL MUNICIPIO

PROMOTORA CASSA, S.A. DE C.V.
 CALLE 36-D No. 477 INT. 1 ENTRE 47-A Y 49, COL. LAS BRISAS DEL NORTE, C.P. 97144, MERIDA,
 YUCATAN
 RFC: PCA-090329-Q17

NÚMEROS GENERADORES

CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO
 DE OXKUTZCAR, YUCATAN.
 LIC. No. FISMDF-OKK-YUC-2018/P2-IR/10 FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2018
 Periodo : DEL 12/dic/2018 AL 30/ene/2019

SE	Lugar	Eje	Tramo	Largo	Ancho	Alto	Peso	Piezas	Volumen	Observaciones
0003	5A080103	MURDE, CADERAS Y CABILLOS								
		MURO DE BLOQUE HUECO DE CONCRETO, TIPO INTERMEDIO CON RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION DE 40 KG/CM ² (RHS 40), DE 18X20X40 (3 HUECOS), ACABADO COMEN A CUALQUIER NIVEL, ASENTADO CON MORTERO CORTEO GRIS-CAL-POLVO EN PROPORCION 1:2:7. ZOCALOS: PAREDES A OBRA, ACABADO HASTA EL LINDAR DE SU UTILIZACION, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, CORTES, AJUSTES, ELABORACION DEL MORTERO, SECORTE DEL MORTERO EN LAS JUNTAS AL BAO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES POREA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, SERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								M2.
	Frente	1	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		2	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		3	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		4	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		5	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		6	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		7	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		8	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		9	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		10	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		11	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		12	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		13	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		14	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		15	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		16	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		17	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		18	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		19	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		20	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		21	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		22	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		23	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		24	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		25	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		26	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		27	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		28	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		29	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		30	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		31	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		32	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		33	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		34	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		35	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		36	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		37	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		38	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		39	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		40	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		41	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		42	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		43	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		44	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		45	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		46	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		47	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		48	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		49	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		50	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		51	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		52	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		53	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		54	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		55	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		56	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		57	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		58	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		59	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		60	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		61	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		62	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		63	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		64	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		65	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		66	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		67	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		68	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		69	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		70	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		71	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		72	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		73	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		74	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		75	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		76	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		77	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		78	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		79	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		80	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		81	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		82	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		83	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		84	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		85	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		86	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		87	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		88	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		89	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		90	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		91	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		92	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		93	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		94	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		95	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		96	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		97	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		98	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		99	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		100	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		101	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		102	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		103	A-B	3.70	2.40	13	115.4400	13	115.4400	CUARTOS 1 AL 13
		104	A-B	3.70	2.40	13				

RESUMEN DE ESTIMACIÓN



BOJA : 1 DE : 1

ESTIMACION No. : 01

CONTRATISTA :	PROMOTORA CAESA, S.A. DE C.V.		IMPORTE DE ESTIMACION :	\$ 877,391.64
PERIODO DEL :	12/12/2018	AL :	30/01/2019	
CONTRATO No. :	FIMDF-CXA-YUC-2018-92-18/10		OBRA :	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA CANTIX DE DOMINGOZ
LOCALIDAD :	OXKUTICAB	FECHA INICIO DEL CONTRATO :	12/12/2018	
MUNICIPIO :	OXKUTICAB	FECHA TERMINO DEL CONTRATO :	30/01/2019	
MONTO CONTRATADO :	\$ 877,391.64		ANTICIPO :	\$ 0.00

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE ESTIMACION	SALDO X ESTIMAR	DEDUCCIONES	
0001	TRABAJOS PRELIMINARES	22,585.78	22,585.78	0.00	22,585.78	0.00	I.C.I.C. 0.00\$	
0002	CIMENTACION	155,858.99	155,858.99	0.00	155,858.99	0.00	OTRAS 0.00\$	
0003	MUROS, CADERNAS Y CASTILLOS	183,061.15	183,061.15	0.00	183,061.15	0.00	TOTAL 0.00\$	
0004	LOSA Y ACABADOS DE AZOTECA	256,267.94	256,267.94	0.00	256,267.94	0.00	IMP. ESTIMACION:	
0005	PIESOS	31,115.07	31,115.07	0.00	31,115.07	0.00	ANTICIPO:	
0006	ACABADOS	91,874.68	91,874.68	0.00	91,874.68	0.00	SUBTOTAL:	
0007	INSTALACION ELECTRICA	34,286.72	34,286.72	0.00	34,286.72	0.00	I.V.A:	
0008	PUERTAS Y VENTANAS	91,307.71	91,307.71	0.00	91,307.71	0.00	IMPORTE BRUTO:	
0010	OBRA EXTRAOR	5,033.60	5,033.60	0.00	5,033.60	0.00	DEDUCCION:	
T O T A L E S						877,391.64	0.00	IMPORTE NETO:
						877,391.64	0.00	\$ 877,391.64

IMPORTE LETRAS : (SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS, 64/100 M.N.)

 Autorizo:	 Eliezer	 Revisó:
PRESIDENTE MUNICIPAL BALANTINO ROMERO ROMERO CONCEJAL UNICO CHUCANAB YUCATAN	CONCEJAL UNICO BALANTINO ROMERO ROMERO ADMINISTRADOR UNICO CHUCANAB YUCATAN	ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M. A. JUNIAMENTO 25/01/2019		

NOTAS DE BITACORA

Fecha: 12 de Diciembre de 2018

Apertura de bitácora de obra

Obra: CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO

Contrato No.: FIS MDF-OXK-YUC-2018-P2-IR/10

Contratante: Municipio de Oxkutzcab

Contratista: PROMOTORA CAESA, S.A. DE C.V.


Dependencia normativa: Municipio de Oxkutzcab, Yucatán


Importe del contrato: \$877,391.64

Periodo de ejecución: Del 12 de Diciembre de 2018 al 30 de Enero de 2019.

Fecha: 12 de diciembre del 2018.

Se da inicio a los trabajos indicados en el contrato FIS MDF-OXK-YUC-2018-P2-IR/10, procediendo a realizar el trazo, nivelación, limpieza y excavación de los primeros cinco cuartos.



C. JOSE REMIGIO DZUL DZUL
ADMINISTRADOR UNICO
PROMOTORA CAESA, S.A. DE C.V.


ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OXKUTZCAB, YUCATAN

Fecha: 17 de diciembre del 2018.

Se terminan los trabajos de cimentación de mampostería de piedra, habilitado, colado de dados; habilitado y colado de cadena de cimentación de los 5 primeros cuartos. Se continúa con la colocación del muro de block y el armado y colado de castillos.


C. JOSE REMIGIO DZUL DZUL
ADMINISTRADOR UNICO
PROMOTORA CAESA, S.A. DE C.V.



ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OXKUTZCAB, YUCATAN





PRESIDENTE MUNICIPAL
RALLANTHO ROVERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATAN
M. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Fecha: 24 de diciembre del 2018.


Se concluye con el techado y acabados de los primeros 5 cuartos, se inicia con la construcción de los siguientes 5 cuartos, con cimentación y dados, colocación de muro de block; habilitado y colado de castillos armados, ahogados de acuerdo lo señalado en los planos.



C. JOSE REMIGIO DZUL DZUL
ADMINISTRADOR UNICO
PROMOTORA CAESA, S.A. DE C.V.


ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OXKUTZCAB, YUCATAN

Fecha: 31 de diciembre del 2018.

Se procede a la preparación de la colocación de techos de los cuartos en construcción así como la colocación de los acabados en muros y plafones, se realiza la instalación eléctrica.



C. JOSE REMIGIO DZUL DZUL
ADMINISTRADOR UNICO
PROMOTORA CAESA, S.A. DE C.V.


ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OXKUTZCAB, YUCATAN

Fecha: 7 de enero del 2018.

Se concluye con la construcción de los cuartos en proceso y se inicia con la cimentación de los últimos 3 cuartos, con el armado y colado de dados, y la colocación de muro de block.



C. JOSE REMIGIO DZUL DZUL
ADMINISTRADOR UNICO
PROMOTORA CAESA, S.A. DE C.V.


ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OXKUTZCAB, YUCATAN

Fecha: 14 de enero del 2019.

Se procede a la realización de los siguientes conceptos: colado de cadena perimetral; colado de losa de vigueta y bovedilla; acabado superior en azotea; aplanados en plafones y muros; entubado la instalación eléctrica de los cuartos en proceso. Se inicia con la aplicación de pintura en los cuartos terminados.


C. JOSE REMIGIO DZUL DZUL
ADMINISTRADOR UNICO
PROMOTORA CAESA, S.A. DE C.V.


ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OXKUTZCAB, YUCATAN




PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATAN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Fecha: 21 de enero del 2019.

Se continúa con la pintura, se concluye con la construcción de los cuartos faltantes, se inicia con la colocación de las puertas y ventanas en todos los cuartos.



C. JOSE REMIGIO DZUL DZUL
ADMINISTRADOR UNICO
PROMOTORA CAESA, S.A. DE C.V.



ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OXKUTZCAB, YUCATAN

Fecha: 28 de enero del 2019.

Se concluye con la pintura y colocación de puertas y ventanas de todos los cuartos. Se inicia con la limpieza de las áreas.



C. JOSE REMIGIO DZUL DZUL
ADMINISTRADOR UNICO
PROMOTORA CAESA, S.A. DE C.V.



ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OXKUTZCAB, YUCATAN

Fecha: 30 de enero del 2019.

Se concluye con todos los trabajos correspondientes al presente contrato, motivo por el cual, se solicita a la dependencia la recepción de dichos los trabajos.




C. JOSE REMIGIO DZUL DZUL
ADMINISTRADOR UNICO
PROMOTORA CAESA, S.A. DE C.V.



ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OXKUTZCAB, YUCATAN



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATAN
R. AYUNTAMIENTO 2018-2021

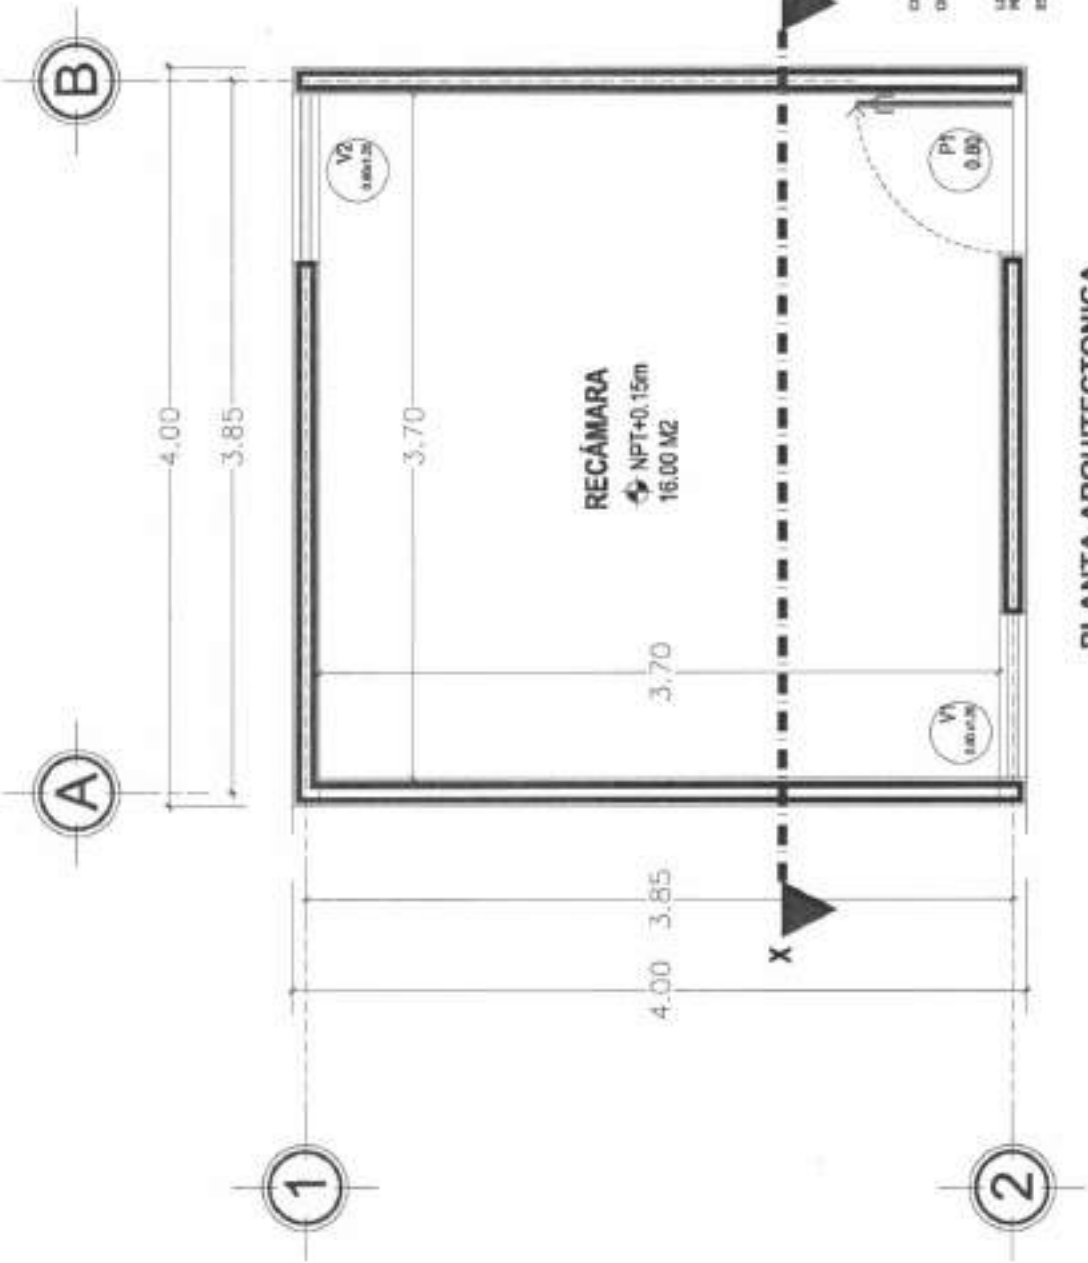

PLANTA ARQUITECTONICA

CROQUIS 1


CONTRATO: DINA
 LOCALIDAD MUNICIPAL: OROQUIÑA
 ESTACION: 1 (URB. UNICA)
 PROYECTO: 13 CUARTOS DOMINIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OROQUIÑA, YACUTAN.
 FECHA DE ELABORACION: 30-08-2018
 REVISOR: [Signature]
 DISEÑADOR: [Signature]

CONTRATISTA:
 C. JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ
 ADMINISTRADOR ARQUITECTO
 PROFESION GONZALEZ, S.A. DE C.V.



PRESIDENTE MUNICIPAL
 RAL ANTONIO HERNANDEZ
 OROQUIETA, YUC.-C.R.
 EL AVANCE DEL MUNICIPIO 2018-2021



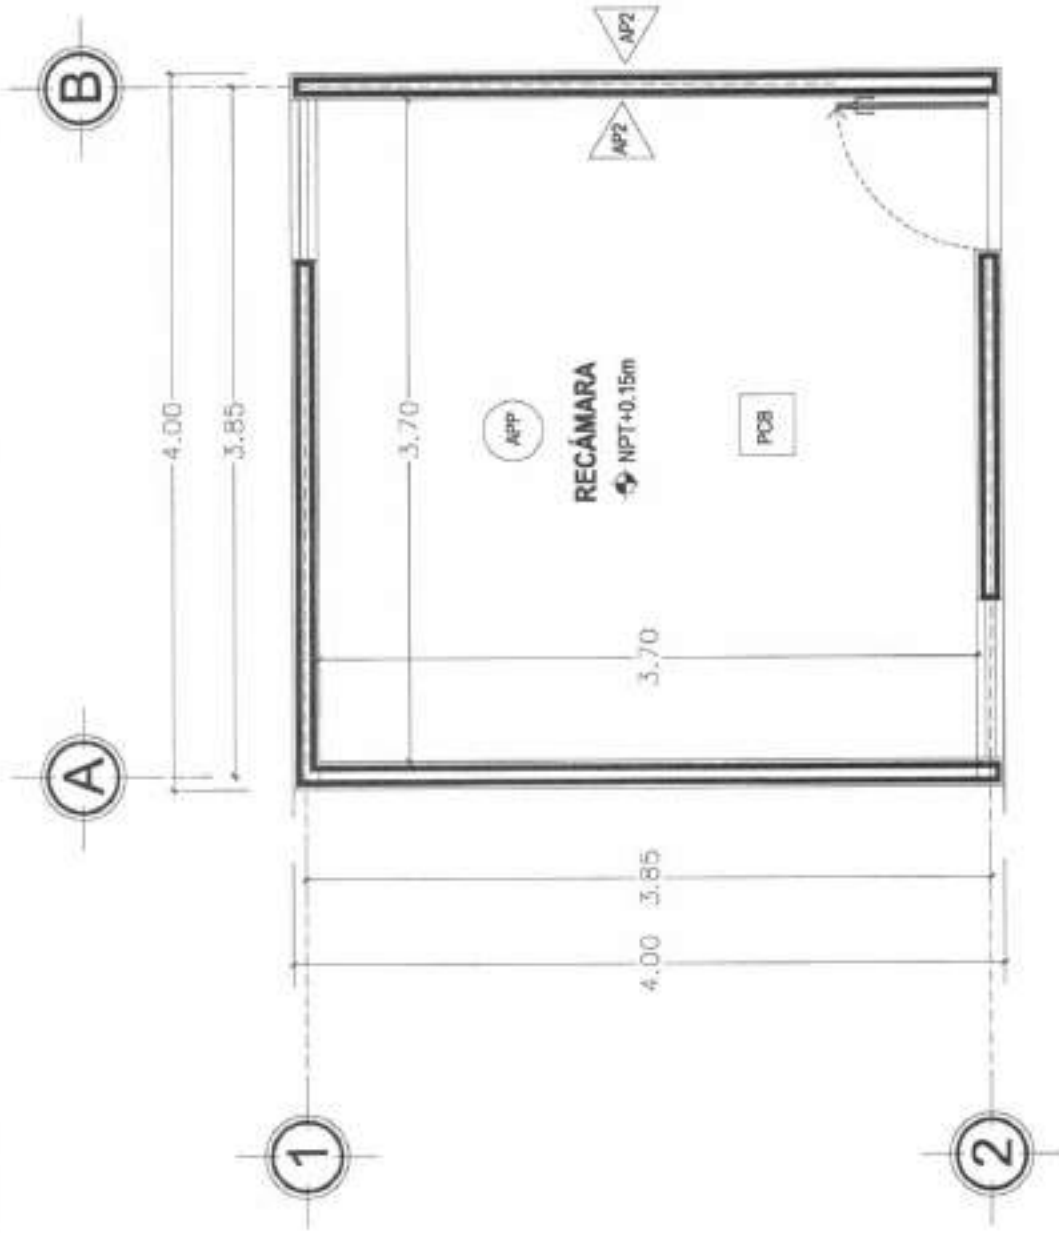


- AP1 APLANADO A TRES CAPAS
- AP2 APLANADO DIRECTO ADEBLOCK O MASILLA
- APP APLANADO EN PLAFON A TRES CAPAS
- PCB PISO DE CONCRETO ACABADO BRUÑIDO

CROQUIS 2

CONTRATO: FISH-006-VIC-2018/0118
 OBRA: CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OROTEPEC, YUCATÁN.
 LOCALIDAD: OROTEPEC, YUCATÁN
 MUNICIPIO: OROTEPEC, YUCATÁN
 ESTIMACION: 1 (UMD, UNDO)
 FECHA DE ELABORACION: 31-08-2019
 PERIODO DE ESTIMACION: 12-OCT-2018 AL 30-09-2019
 C. JOSE GONZALO DE LA DEULA
 ADMINISTRADOR UNICO
 INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.

PLANTA ALBAÑILERIA


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 RAUL ESTEBAN RAMIREZ CHEL
 CROQUIS 2019-10-01
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

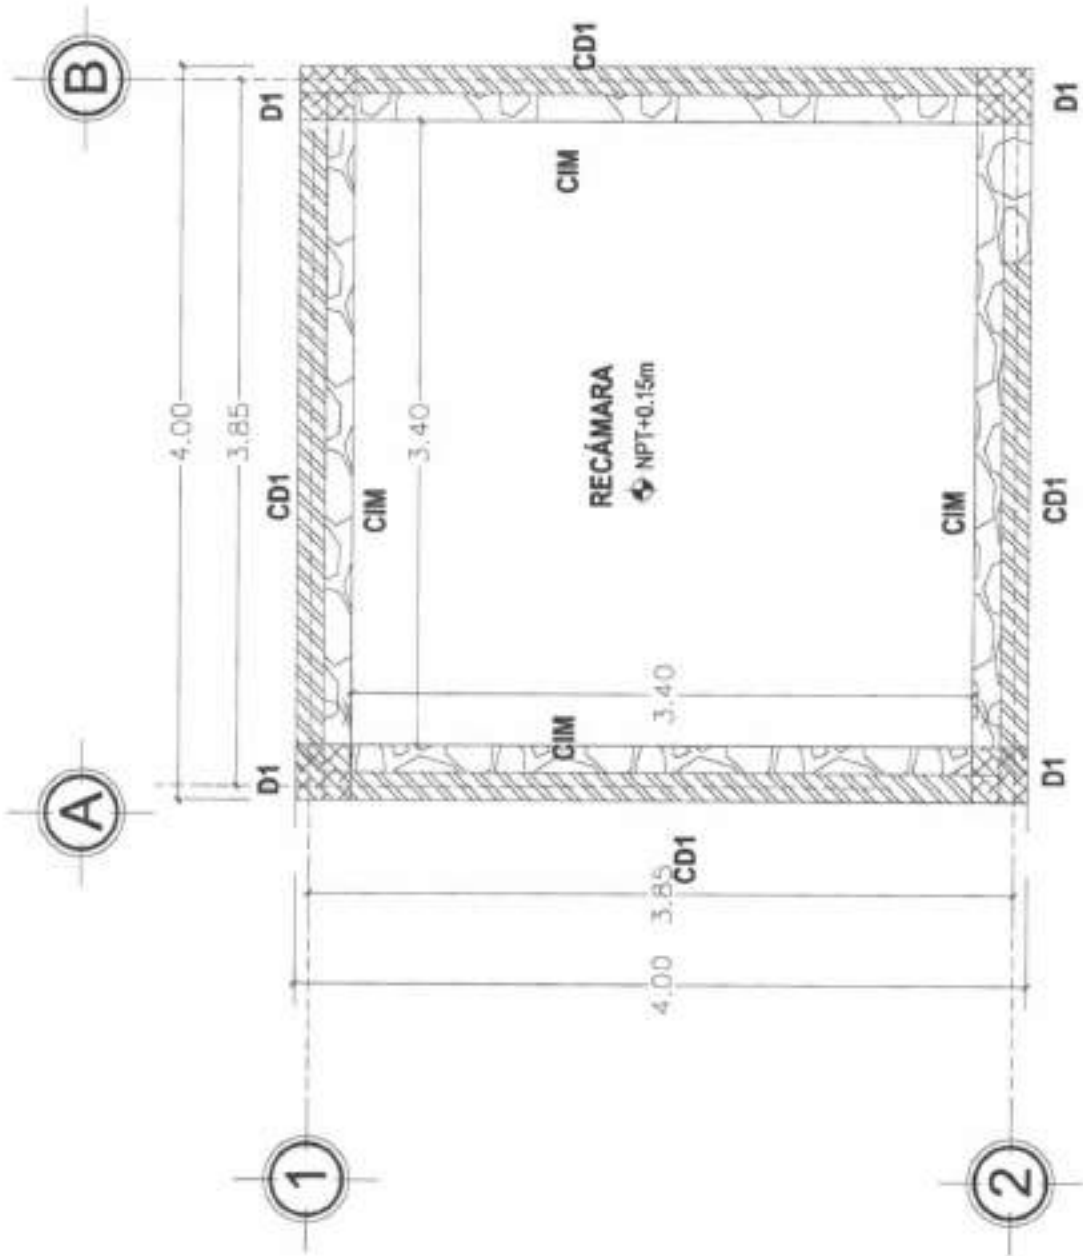


CROQUIS 3

CONTRATO: PERMISO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OROQUENA, TACNA.
 LOCALIDAD: OROQUENA, TACNA.
 ESTACION: 1 (URB. UNIDA)
 FECHA DE ELABORACION: 31-09-2018
 REVISADO DE ESTACION: 11-09-2018 A. 30.000-2018
 REVISOR: [Firma]
 C. JOSÉ EDUARDO DEL ROSA
 ADMINISTRADOR UNICO
 PRODUCTORA CHINA, S.A. DE C.A.



PRESIDENTE DEL COMITÉ
 PALLAY ANDINO ROMERO CHIRI
 CALLE DE LA INDEPENDENCIA
 EL MONTE AEREO 2016-2017

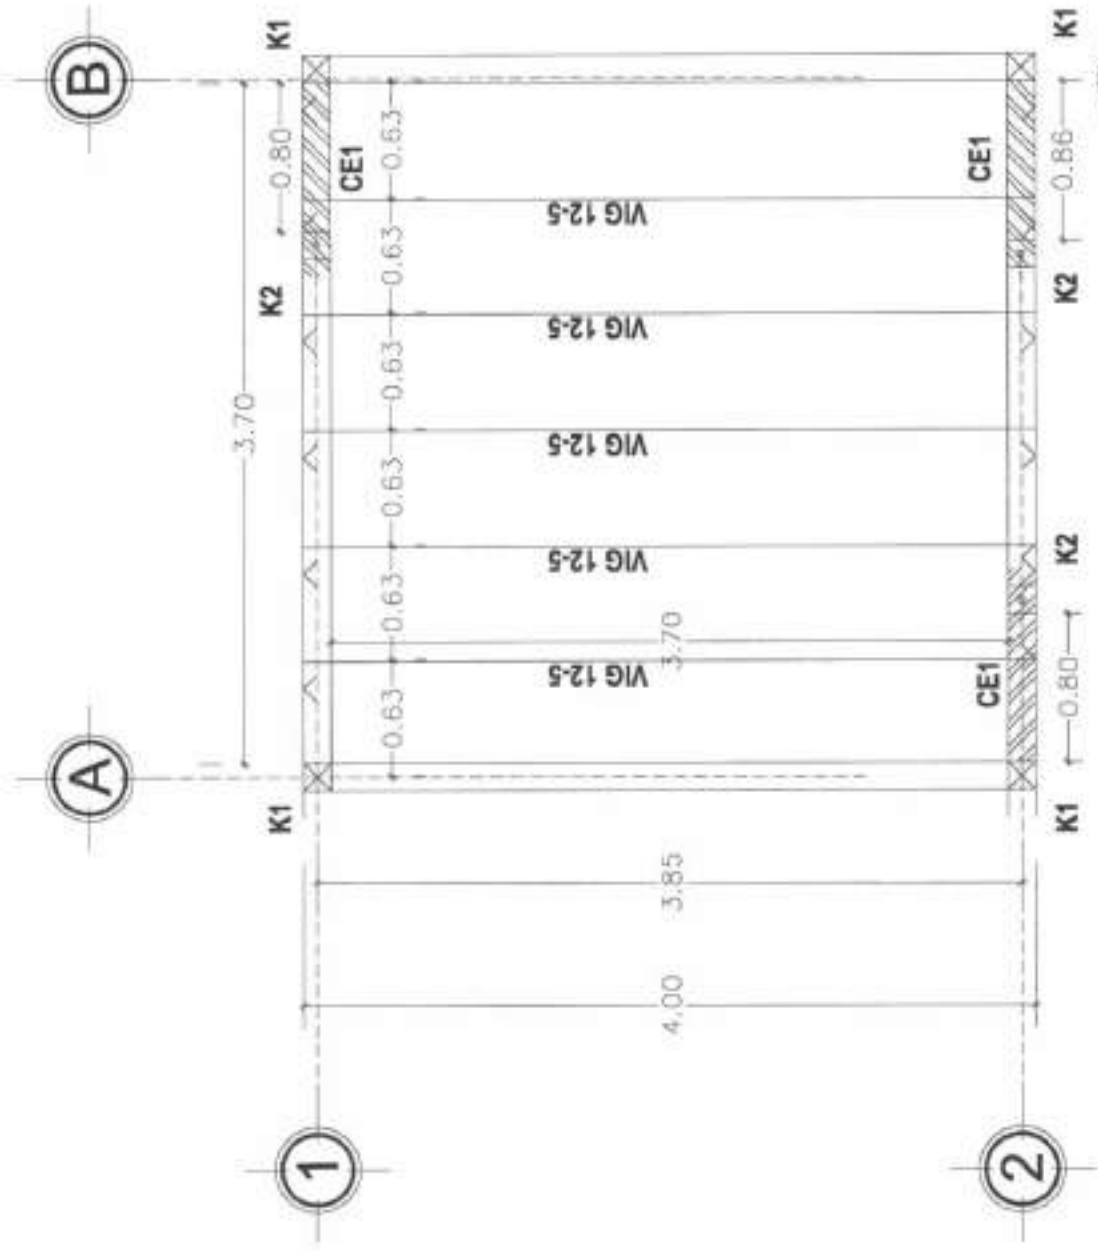

CROQUIS 4

CONTRATO: FPMSP-005-P/LC-2016/PS-10/13
 OBRA: CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS COMPLETOS EN LA LOCALIDAD Y PARAJE DE OMBUTINA, YUCATAN.
 LOCALIDAD: OMBUTINA, YUCATAN.
 ESTACION: 1 (EDEL UNICA)
 FECHA DE ELABORACION: 31-DIC-2019
 PROYECTO DE ESTACION: 13-DIC-2019 A LAS 10:00 HRS.
 CORTADORA: [Signature]
 C. JOSE ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
 INGENIERO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA
 PROMOTORA OMBUTINA, S.A. DE C.V.



PRESIDENTE MUNICIPAL
 RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
 CRUZCAYU XINCHAY
 AYUNTAMIENTO 2016-2021

CRITERIO ESTRUCTURAL

REPORTE FOTOGRAFICO EST 1


OBRA: CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN

CONTRATO: FIS MDF-OXK-YUC-2018-P2-IR/10




EXCAVACION, CIMIENTO, DESPLANTE, CADENA SOBRE CIMENTACION, DADOS DE CONCRETO, ANCLAJE DE CASTILLO, CADENAS, CASTILLOS.


C. JOSE REMIGIO DZUL DZUL
ADMINISTRADOR UNICO
PROMOTORA CAESA, S.A. DE C.V.


ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OXKUTZCAB, YUCATAN




PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATAN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


REPORTE FOTOGRAFICO EST 1


OBRA: CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN

CONTRATO: FISMDF-OXK-YUC-2018-P2-IR/10



CADENAS DE NIVELACION SOBRE MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA


C. JOSE REMISIO DZUL DZUL
ADMINISTRADOR UNICO
PROMOTORA CAESA, S.A. DE C.V.


ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OXKUTZCAB, YUCATAN



PRESIDENTE MUNICIPIO
FALCÓN ANTONIO ROMÉ
OXKUTZCAB, YUC.
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

REPORTE FOTOGRAFICO EST 1

OBRA: CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN

CONTRATO: FIS MDF-OXK-YUC-2018-P2-IR/10



APLANADOS, INSTALACION ELECTRICA, PUERTAS Y VENTANAS

C. JOSE REMIGIO DZUL DZUL
ADMINISTRADOR UNICO
PROMOTORA CAESA, S.A. DE C.V.

ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OXKUTZCAB, YUCATAN


PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO ROMERO CHE
OXKUTZCAB, YUCATAN
H. AYUNTAMIENTO 2016-2020
