

CONSTRUCCION EN OBRAS CIVILES Y SERVICIOS GENERALES

RFC emisor: SC110805359
 Nombre emisor: SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV
 Folio: 090
 RFC receptor: MOY8501019K3
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

F24C5B7E-0072-4781-8176-C882BFF9367A
 0000100000413013557
 97970 2019-06-03 08:40:44
 Ingreso
 General de Ley Personas Morales

Conceptos

Código del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Código de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta postal	
72141104		1	048	SERVICIO	763206.66	763206.66				
Descripción:	RECIBI DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN LA CANTIDAD \$ 881,839.73 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N.) POR PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 DE LOS TRABAJOS DE OBRA " REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA", SEGUN CONTRATO No. FISMDF-00X-YUC-2019-LP07. IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 1,086,000.00 AMORTIZACION DE ANTECI PO \$ 325,900.00 SUBTOTAL \$ 760,200.00 IMPUESTO AL VALOR AGREGA DO \$ 121,633.07 SUBTOTAL \$ 881,833.07 RETENCION DEL 0.0% \$ 0.00 ALCANC E LIQUIDO DE LA ESTIMACION \$ 881,839.73				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Coeficiente	Importe
					IVA	Tributo	763206.66	Tasa	16.0000%	121633.07

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 760,206.66
 Impuestos trasladados IVA 16.0000% \$ 121,633.07
 Total \$ 881,839.73

Sello digital del CFDI:

[[1.1F24C5B7E-0072-4781-8176-C882BFF9367A2019-06-03T08:44:01]SAT9707011NN3[[BLxabbgmC0Oul+SRxD7]XELGoAzni9sZvEtl0K2Ule4FYDQPUhfOBT3eElt0P2Jp6Rgk80Tat0hgqFweEDumT6R3ydMN3kwZzV4k9XN2V6XTERIFE+5XY+5GmawRkC4x0PZHa8YHLNpu4uDuFbaD3757g180Spu7MPyMM1BeQn9Wj850pq+MLDiz2mCVJp051/PxJbrPyHweR3WwVH8x0G8LAjyx+RFU4M6ergQx0jLZdLY+FGZgrK06vVL5ozQJLNPQWkprQuQW6Ptyv2zVPODQkm5D18MC17JFG035CHrsSahQ==0000100000403258748]]

Sello digital del SAT:

Y7EJAZkysrC0UlnaETD1mQeXg8QxwVTnMyw6ypPwg8Na2jg865wEaeh0CR98o2RDrZYBNPNEeud1ydeFMLENndZ9r6lywahgGCh9cYzLzMPvgbD0vZvWNAF+EjyT7HfugKV08JLJr89Sg9Nt6P[NFDR8eLZ1heyRABeFQrysuGn3ByJMD0Yv7j8FBW5mp3dcVeuTRmdBZ43kY06+e4F+0Q[PuU6ezPh4WRumj20TUDaZsQhwXacEIR2UBH4Gz17FtshUdwMw05WbuVUVjYmQgGqFDN8309R9K29o+7VXuoEU+80taDYA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1F24C5B7E-0072-4781-8176-C882BFF9367A2019-06-03T08:44:01]SAT9707011NN3[[BLxabbgmC0Oul+SRxD7]XELGoAzni9sZvEtl0K2Ule4FYDQPUhfOBT3eElt0P2Jp6Rgk80Tat0hgqFweEDumT6R3ydMN3kwZzV4k9XN2V6XTERIFE+5XY+5GmawRkC4x0PZHa8YHLNpu4uDuFbaD3757g180Spu7MPyMM1BeQn9Wj850pq+MLDiz2mCVJp051/PxJbrPyHweR3WwVH8x0G8LAjyx+RFU4M6ergQx0jLZdLY+FGZgrK06vVL5ozQJLNPQWkprQuQW6Ptyv2zVPODQkm5D18MC17JFG035CHrsSahQ==0000100000403258748]]

RFC del proveedor de certificación: SAT9707011NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-03 08:44:01
 No. de serie del certificado SAT 0000100000403258748




 PRESIDENTE MUNICIPAL
 RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
 OXKUTZCAB, YUCATAN
 EL AYUNTAMIENTO 25/5/2021

SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.
CONTROL FINANCIERO

CONTRATO: FISMDF-GR-YUC-2019-LP/07

ESTIMACIÓN: 01

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA.
CONTRATO No.: FISMDF-GR-YUC-2019-LP/07

FECHA DE ESTIMACION: 07-jun-2019

LOCALIDAD: E. ZAPATA

PERIODO: 13-may-2019 AL: 03-jun-2019

MUNICIPIO: OXIMTZUC

CONTRATISTA: SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

I M P O R T E S	L I Q U I D A C I O N (\$)	
VALOR DE LA ESTIMACION		01,086,009.52
30.00% AMORTIZACION DE ANTICIPO		0325,802.86
SUBTOTAL		0760,206.66
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0121,633.07
SUBTOTAL DEL VALOR DE LA ESTIMACION		0881,839.73
RETENCIONES:		
0.00% P.G.T.C.I.		00.00
0.00% DERECHO Y SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL:		00.00
0.00% OBRAS Y SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL:		00.00
SUBTOTAL RETENCIONES:		00.00
ALCANCE LIQUIDO DE LA ESTIMACION		0881,839.73

A N T I C I P O	S/IVA	C/IVA
IMPORTE ANTICIPO	0518,455.81	0596,768.85
AMORTIZACION ACUMULADO ANTERIOR	00.00	00.00
AMORTIZACION ESTA ESTIMACION	0325,802.86	0377,931.32
AMORTIZACION A LA FECHA	0325,802.86	0377,931.32
SALDO POR AMORTIZAR	0188,453.05	0218,837.53

ESTADO DE CUENTA + CONVENIO	S/IVA	C/IVA
IMPORTE ACTUAL CONTRATADO	01,714,893.03	01,989,228.52
ACUMULADO ANTERIOR	00.00	00.00
ESTA ESTIMACION	01,086,009.52	01,350,771.04
ACUMULADO A LA FECHA	01,086,009.52	01,259,771.04
SALDO POR EJERCER	0628,883.51	0729,458.48



PRESIDENTE MUNICIPAL
PAUL ANTONIO ROYER GONZALEZ
ORGANIZACION MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

CALLE 57 No. 145-B X 24 Y 26 COLONIA YOCCHENKAX, TEXAX, YUCATÁN.

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

ESTIMACION No. : 01

HOJA : 1 DE : 1

CONTRATISTA : SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

DEPARTAMENTO :

PERIODO DEL : 13-may-2019 Al : 03-jun-2019
 CONTRATO No. : FISMED-008-YUC-2019-16/D7
 LOCALIDAD : E. ZAPATA
 MUNICIPIO : OXKUTZ'KAB
 MONTO CONTRATADO : \$ 1,989,229.52

IMPORTE DE ESTIMACION : \$ 1,086,009.52
 CERA : CERA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA
 FECHA INICIO DEL CONTRATO : 13-may-2019
 FECHA TERMINO DEL CONTRATO : 10-ago-2019
 ANICIPIO : \$ 514,455.91

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE ESTIMACION	SALDO X ESTIMAR	RECONTOINSE
01	ZERELINDIAJES	115,677.84	115,677.84	0.00	0.00	0.00	3-C.F.C. 1.008 \$ 0.00
02	TERRACERIAS	170,101.43	170,101.43	0.00	0.00	0.00	OTRAS 0.008 \$ 0.00
03	BASE HIDRAULICA	327,118.13	327,118.13	0.00	0.00	0.00	SOCIAL 0.008 \$ 0.00
04	PAVIMENTOS	1,101,455.82	473,112.12	0.00	473,112.12	628,843.51	IMP. ESTIMACION: \$ 1,086,009.52
T O T A L E S		1,714,853.93	1,084,009.52	0.00	1,084,009.52	628,843.51	ARTICULO: \$ 353,802.86
							SUBTOTAL: \$ 750,204.85
							IVA: \$ 121,633.07
							IMPORTE SECTOR: \$ 891,839.73
							DEDUCCION: \$ 0.00
							IMPORTE NETO: \$ 891,839.73

IMPORTE LETRAS : (SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N.)

\$ 891,839.73



PRESIDENTE MUNICIPAL
 RAUL ANTONIO RICHEO CHEL
 OXKUTZ'KAB YUCATAN
 M. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Autorizó

ELABORÓ

Revisó

TÉC. RAUL ANTONIO RICHEO CHEL C. LUIS SANTIAGO ROSA SANTABARRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL ADMINISTRADOR (NETO) DIR. ESTADOS VAQUERES CASHE
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.
CALLE 57 No. 15-B X 24 Y 26 COLONIA YOCCHENKAX, TEKAX, YUCATAN.

ESTIMACIÓN

HOLA 3 DE 3

OPERADO FISM

PROGRAMA : SAN 33

LOCALIDAD : E. SAPATA

CONTRATO No. : FISMIF-008-VUE-2013-28/ST

FECHA DE INICIO : 13-may-2013

FECHA DE TERMINACION : 10-ago-2013

IMPORTE : 1,259,773.04

CONTRATISTA : SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

CONTRATO : FISMIF-008-VUE-2013-28/ST

FECHA : 10-may-2013

CLAVE	CONCEPTO	FTE	UNID	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	VOLUMEN		IMPORTE ESTIMADO		
							PRESENTE	ACUM. TOTAL			
SD012	FORMACION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO, UTILIZANDO MATERIALES DE 3/8 A FINOS Y 4 CMS. DE ESPESOR COMACTO, SE APLICADA RINGO DE LIGA A RAZON DE 1.00 1740 CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE RENAJADA AL 80% (RUE EMULSION-20% AGUA) COMBINADOS CON UNA CAPA DE 3/8* APLICADO DE FORMA MANUA. (FORZO), DESPUES LA APLICACION SEBENA SEB CON PAVIMENTADORA FINISHER Y SE CONTINUANDO EL PROCESO CON ROLLIDO 2250 CONTINUANDO EL PROCESO CON ROLLIDO HEUMISTICO DE FORMA ALTERNADA). INCLUDE: EQUIPO, MANO DE OBRERA, TRANSPORTE DE LOS MATERIALES DE LA PLANTA HASTA LA OBRA Y VUELVO DE OBRA.		M2	733.29	4,436.40	9.00	2,029.00	5,629.00	0.00	473,112.12	
							TOTAL PAVIMENTOS				473,112.12
							SUBTOTAL				1,086,009.32
							I.E.CO + IVA				173,761.82
							TOTAL ESTIMACION				1,259,771.04



 Ing. Filiberto Flores Canche



 Ing. Martin Gosa Castañeda



 Ing. Antonio Romero Chel



 PRESIDENTE MUNICIPAL



 ADMINISTRADOR UNICO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE MUNICIPAL
 PAUL ANTONIO ROMERO CHEL
 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.
CALLE 57 No. 145-B X 24 Y 26 COLONIA YOCCHENKAX, TEKAX, YUCATAN.

ESTADO DE CUENTA HASTA LA ESTIMACIÓN NO. 01

PROGRAMA :	RAMO 33	CONTRATISTA :	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.		
LOCALIDAD :	B. SAPATA	CONTRATO :	FISMOP-CMX-YUC-2018-LP/07	FECHA :	12-may-2019
MUNICIPIO :	OXHUTZ'KAB	FECHA DE INICIO :	13-may-2019	TERMINACIÓN :	30-ago-2019
OBRA :	OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO SAPATA. CONTRATO No.: FISMOP-03X-YUC-2018-LP/07				
CONT. (I/IVA) :	01,714,853.03	AMPLIACIÓN :	00.00	ANTICIPO :	6514,455.91

ESTADO DE CUENTA
HASTA LA ESTIMACIÓN NO. 01

FECHA : 03-jun-2019

IMPORTE DEL CONTRATO :	01,714,853.03
IMPORTE DE ESTIMACIONES ANTERIORES :	00.00
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN :	01,066,009.52
SALDO	0628,843.51
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO :	
IMPORTE DEL ANTICIPO :	6514,455.91
AMORTIZADO ESTIMACIONES ANTERIORES :	00.00
AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN :	3325,802.86
SALDO	3188,653.05

ATENTAMENTE

SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.
C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA

TORZÓ

TEC. RAUL ANTONIO ROSERO CHEL
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO ROSERO CHEL
OXHUTZ'KAB YUCATAN
PLAYUNTAMIENTO 2018-2021

V. O. C.

ING. FILIBERTO VARGUES CANCHE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OPERADO FISM

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA.
 CONTRATO No.: FISMDF-00X-YUC-2019-1P/07

Período: 01/05/2019 AL 03/Jun/2019

Met	Logar	Eje	Tramo	Longu	Ancho	Alto	Peso	Flacas	VoluMan	Observaciones
SERVICIO PRELIMINAR										
ESCARIFICACION DE PAVIMENTO DE MAL ESTADO DE BUELA 30 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUIE: DESALJO DEL MATERIAL PARTICULANZE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.										
FRANCO										
01	C/H	C- DE LU	V HOMBRES	105.00	3.00			1	525.0000	
01	C- DE LU	HOMBRES	V C. DEL	105.00	4.50			1	459.0000	
01	C- CHAM BEN	C- LABRA	HOMBRES	231.00	4.50			1	1,044.0000	
01	C- LABRA	CHARRS	HOMBRES	185.00	4.50			1	831.0000	
01	C- E. ZAPATA	3/H	CER. OR	175.00	4.50			1	785.0000	
01	C- Z/H	E. ZAPAT		189.00	4.50			1	810.0000	
							Total Frente		4,435.0000	M2
							Total Concepto	560010	4,435.0000	M2
SERVICIO ISOGRAFIA CON TALAR Y REVELACION EN CALA STAPA DE LA CONSTRUCCION, INCLUIE: MATERIAS, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.										
FRANCO										
01	C/H	C- DE LU	V HOMBRES	105.00	3.00			1	525.0000	
01	C- DE LU	HOMBRES	V C. DEL	105.00	4.50			1	459.0000	
01	C- CHAM BEN	C- LABRA	HOMBRES	231.00	4.50			1	1,011.0000	
01	C- LABRA	CHARRS	HOMBRES	185.00	4.50			1	831.0000	
01	C- E. ZAPATA	3/H	CER. HA	170.00	4.50			1	765.0000	
01	C- Z/H	E. ZAPAT		180.00	4.50			1	810.0000	
							Total Frente		4,435.0000	M2
							Total Concepto	560002	4,435.0000	M2



PRES. SITE LOCAL

 C. E. ZAPATA

 MUNICIPALIDAD DE YUCATAN

 REGISTRO MUNICIPAL

 EQUIPAMIENTO 2018-2021

OPERADO FISM

SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA.
 CONTRATO No.: FISMDE-02K-YUC-2019-LP/07

Fecha: 01/06/2019 AL 03/Jun/2019

Det	Ungar	Eje	Trama	Long.	Ancho	Alto	Preso	Pisera	Volumen	DESCRIPCIONES
TERRACERIAS										
02	FORMACION DE TERRACERIAS COMPENSADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCARIFICACION. INCLUYE MOBILIDAD, ESTUDIO Y COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS, RETENCION CON UNA TOLERANCIA DE 1 CM. EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBR.									
580004										
Frente										
01	C/N	C- DE 10'	V. NOROCC	101.00	3.00			1		325.0000
01	C- DE 10'	NOROCC	V. C. DEL	101.00	4.50			1		455.0000
01	C- OTRAS ESH	C. LARGA	NOROCC	272.00	4.50			1		1,224.0000
01	C- LARGA	CHAMBE	NOROCC	185.00	4.50			1		832.5000
01	C- E. ZAPATA	S/N	DEL NA	170.00	4.50			1		765.0000
01	C- S/N	E. ZAPATA		180.00	4.50			1		810.0000
Total Frente									4,435.5000	M2
Total concepto									580004	M2
BASE HIDRAULICA										
03	FORMACION DE LA BASE HIDRAULICA DE 12 CM. DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BUNDO GRABADO DE 3 A 2". TENDIDO Y COMPACTADO AL 15%, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBR. Y MATERIALES DEPOSITADOS EN EL SITIO DE TRABAJO.									
580018										
Frente										
01	C/N	C- DE 10'	V. NOROCC	101.00	3.00			1		325.0000
01	C- DE 10'	NOROCC	V. C. DEL	102.00	4.50			1		455.0000
01	C- OTRAS ESH	C. LARGA	NOROCC	272.00	4.50			1		1,224.0000
01	C- LARGA	CHAMBE	NOROCC	185.00	4.50			1		832.5000
01	C- E. ZAPATA	S/N	DEL NA	170.00	4.50			1		765.0000
01	C- S/N	E. ZAPATA		180.00	4.50			1		810.0000
Total Frente									4,435.5000	M2
Total concepto									580018	M2



PRESIDENTE MUNICIPAL

 EMILIANO ZAPATA, YUCATAN

 GOBIERNO MUNICIPAL

 MUNICIPIO DE TEXAX

 YUCATAN



SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.
 CALLE 57 X 24 Y 26 No. EXTERIOR 145 B COLONIA YOCHEKAK, LOCALIDAD TEKAX, MUNICIPIO DE TEKAX,
 YUCATAN.

OPERADO FISM

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA,
 CONTRATO No. 1 FISMDF-02K-YUC-2019-LP/07

Extr-0000 1 DEL 11/may/2019 AL 03/jun/2019

Cat	Impar	Eda	Tramo	Calzop	Acido	Alto	Piso	Pizaa	Valores	Observaciones	
04			PAVIMENTOS								
01	01	01	FONCTOR DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO, OPTIMIZADO MATERIALES DE 3/8 A FINOS Y 4 CMS. DE ESPESOR COMPACTO, SE ABITARA RIGIDO DE LISA A RASO DE 1.00 LT/M2 CON EMULSION CATIONICA SUPRESIBLE BAJAJA AL 504 (804 EMULSION-224 ASOAI CURBIENDOSE CON ORA CANA DE 3/8" APLICADO DE FORMA MANUAL (FORNO), DESPUES LA APLICACION DEBERA SER CON PAVIMENTADORA (STRIBBER) Y SE CONTINUARÁ EL PROCESO CON RODILLO LISO CONTINUANDO EL PROCESO CON RODILLO NEUMÁTICO (DE FORMA ALTERNADA), INCLUYE: EQTIFO, HERRAMIENTA, TRANSPORTE DE LOS MATERIALES DE LA PLANTA HASTA LA OBRA Y MANO DE OBRERA.								
01	01	01	C- UR 10	V. NOROEN	103.00	5.00		1	529.0000		
01	01	01	MUJER	V. C. DEL	107.00	4.50		1	459.0000		
01	01	01	C. LAMA	MUJER	233.00	4.50		1	1,044.0000		
									Total Frente	3,032.0000	M2
									Total Concepto	380012	M2
									3,032.0000	M2	

[Handwritten Signature]




 PRESIDENTE MUNICIPAL
 WILLIAMS ROMERO CHEL
 DOMITILIAE YUCATAN
 PLANEAMIENTO 2018-2021

[Handwritten Signature]

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA

NO. CONTRATO: FISMDF-0XK-YUC-2019-LP/07

CONTRATISTA: SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

ESTIMACION 1



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO ALONSO CHEL
OXXUTOCAB YUCATAN
EL AYUNTAMIENTO 2018-2021

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Municipal President.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the contractor.

A handwritten mark or initials in black ink, possibly a signature or a specific mark.

OPERADO FISM

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA

NO. CONTRATO: FIS MDF-0XK-YUC-2019-LP/07

CONTRATISTA: SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.



ESTIMACION 1



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OPERADO FISM.

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA

NO. CONTRATO: FISMDF-0XK-YUC-2019-LP/07

CONTRATISTA: SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

ESTIMACION 1



PRESENTE ANTE EL
- RAUL ANTONIO POLERO CHEL
CASATELUCATAN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

OPERADO FISM

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA

NO. CONTRATO: FISMDF-0XK-YUC-2019-LP/07

CONTRATISTA: SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

ESTIMACION 1



[Handwritten signatures and initials]

OPERADO FISM



BITACORA DE OBRA



ESTIMACIÓN No. 01

CONTRATO No. FISMDF-OXK-YUC-2019-LP/07

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA

CONTRATISTA: SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

<p>NOTA#01 FECHA 13/05/2019</p>	<p>CON ESTA FECHA SE REALIZA LA APERTURA DE LA PRESENTE BITÁCORA RELATIVA AL CONTRATO No: FISMDF-OXK-YUC-2019-LP/07 DE LA OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, LA CUAL SERÁ SUPERVISADA POR PARTE DEL MUNICIPIO OXKUTZCAB, EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EL ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE Y POR PARTE DE LA CONTRATISTA SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V. EL ING. REY DAVID EHUAN AREVALO, SE REALIZA EL REGISTRO DE FIRMAS Y SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES CRITERIOS Y RECOMENDACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none">1. LA BITÁCORA DE OBRA SERÁ EL MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL SE ASENTARÁ CUALQUIER CAMBIO Y MODIFICACIÓN AL PROYECTO.2. SE LE RECOMIENDA COLOCAR SUS SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS Y RESTRICTIVAS Y CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE QUE SE PROPORCIONARON ANEXAS AL CONTRATO.
<p>FIRMA</p>  <hr/> <p>POR LA EMPRESA CONTRATISTA ING. REY DAVID EHUAN AREVALO</p>	<p>FIRMA</p>  <hr/> <p>POR LA SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE</p>

<p>NOTA#02 FECHA 13/05/2019</p>	<p>PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA LA EMPRESA CONTRATISTA CUENTA CON UNA FUERZA DE TRABAJO DE 1 MOTOCONFORMADORA, VIBROCOMPACTADOR DE 10 TON, 1 PIPA DE AGUA 5,000.00 LTS., 1 VOLQUETE DE 7 M3, 1 RETROEXCAVADORA, 1 CAMIONETA PICK UP, 1 SOBRESTANTE, 3 AYUDANTES GENERALES, SE INICIA EL ESCARIFICADO DEL PAVIMENTO EN MAL ESTADO.</p>
<p>FIRMA</p>  <hr/> <p>POR LA EMPRESA CONTRATISTA ING. REY DAVID EHUAN AREVALO</p>	<p>FIRMA</p>  <hr/> <p>POR LA SUPERVISIÓN ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE</p>


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. ANTONIO RICMERO CHEN
OXKUTZCAB, YUCATAN
N. AYUNTAMIENTO 2018-2021



OPERADO FISM

BITACORA DE OBRA



ESTIMACIÓN No. 01

CONTRATO No. FISMDF-OXX-YUC-2019-LP/07

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA

CONTRATISTA: SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

NOTA#03 FECHA 18/05/2019	CON ESTA FECHA DE NOTIFICA A LA SUPERVISION DEL MUNICIPIO SE CONINUA CON LA ESCARIFICACION DE PAVIMENTO EN MAL ESTADO Y SE INICIA LA FORMACION DE TERRACERIA CON EL MATERIAL ESCARIFICADO, EL SUMINISTRO DE MATERIAL CEMENTANTE DE 2" A FINOS PARA LA FORMACION DE BASE HIDRAULICA.	
FIRMA  POR LA EMPRESA CONTRATISTA ING. REY DAVID EHUAN ARÉVALO	FIRMA  POR LA SUPERVISIÓN ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE	

NOTA#04 FECHA 21/05/2019	CON ESTA FECHA DE NOTIFICA A LA SUPERVISION DEL MUNICIPIO SE CONCLUYE LA ESCARIFICACION DE PAVIMENT EN MAL ESTADO, SE CONINUA CON LA FORMACION DE TERRACERIA CON EL MATERIAL ESCARIFICADO, EL SUMINISTRO DE MATERIAL CEMETANTE DE 2" A FINOS PARA LA FORMACION DE BASE HIDRAULICA.	
FIRMA  POR LA EMPRESA CONTRATISTA ING. REY DAVID EHUAN ARÉVALO	FIRMA  POR LA SUPERVISION ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE	

NOTA#05 FECHA 27/05/2019	CON ESTA FECHA DE NOTIFICA A LA SUPERVISION DEL MUNICIPIO SE CONCLUYE LA FORMACION DE TERRACERIA CON EL MATERIAL ESCARIFICADO, SE INICIA LA FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL CEMENTANTE DE 12 CM. DE ESPESOR.	
--------------------------------	--	--

  PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. ANTONIO ROMERO CH
CIUDAD DE YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2016-2021 

OPERADO FISM


BITACORA DE OBRA



ESTIMACIÓN No. 01



CONTRATO No. FISMDF-OXK-YUC-2019-LP/07

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA

CONTRATISTA: SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

<p>FIRMA</p>  <hr/> <p>POR LA EMPRESA CONTRATISTA ING. REY DAVID EHUAN ARÉVALO</p>	<p>FIRMA</p>  <hr/> <p>POR LA SUPERVISIÓN ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE</p>
---	---

<p>NOTA#06 FECHA 31/05/2019</p>	<p>CON ESTA FECHA DE NOTIFICA A LA SUPERVISION DEL MUNICIPIO SE CONCLUYE LA FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL CEMENTANTE DE 12 CM. DE ESPESOR Y SE INICIA EL TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 4 CM. DE ESPESOR.</p>
<p>FIRMA</p>  <hr/> <p>POR LA EMPRESA CONTRATISTA ING. REY DAVID EHUAN ARÉVALO</p>	<p>FIRMA</p>  <hr/> <p>POR LA SUPERVISIÓN ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE</p>

<p>NOTA#06 FECHA 03/06/2019</p>	<p>CON ESTA FECHA DE NOTIFICA A LA SUPERVISION DEL MUNICIPIO SE CONTINUA CON EL TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 4 CM. DE ESPESOR.</p>
<p>FIRMA</p>  <hr/> <p>POR LA EMPRESA CONTRATISTA ING. REY DAVID EHUAN ARÉVALO</p>	<p>FIRMA</p>  <hr/> <p>POR LA SUPERVISIÓN ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE</p>


PRESIDENTE MUNICIPAL
RAFAEL ANTONIO REARTE CHEL
CONSTITUCIÓN 1917
H. AYUNTAMIENTO 2019-2021



SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

EMILIANO ZAPATA EST. No. 1

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA

OPERADO FISM



[Signature]

[Signature]

**PRESIDENTE MUNICIPAL
M. ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATÁN
MANIFIESTO 2018-2021**


OXKUTZCAB, YUCATÁN
LOC. EMILIANO ZAPATA

FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CM. DE ESPESOR
FORMACION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 4 CM. DE ESPESOR

SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

EMILIANO ZAPATA EST. No. 1
OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA

OPERADO FISM

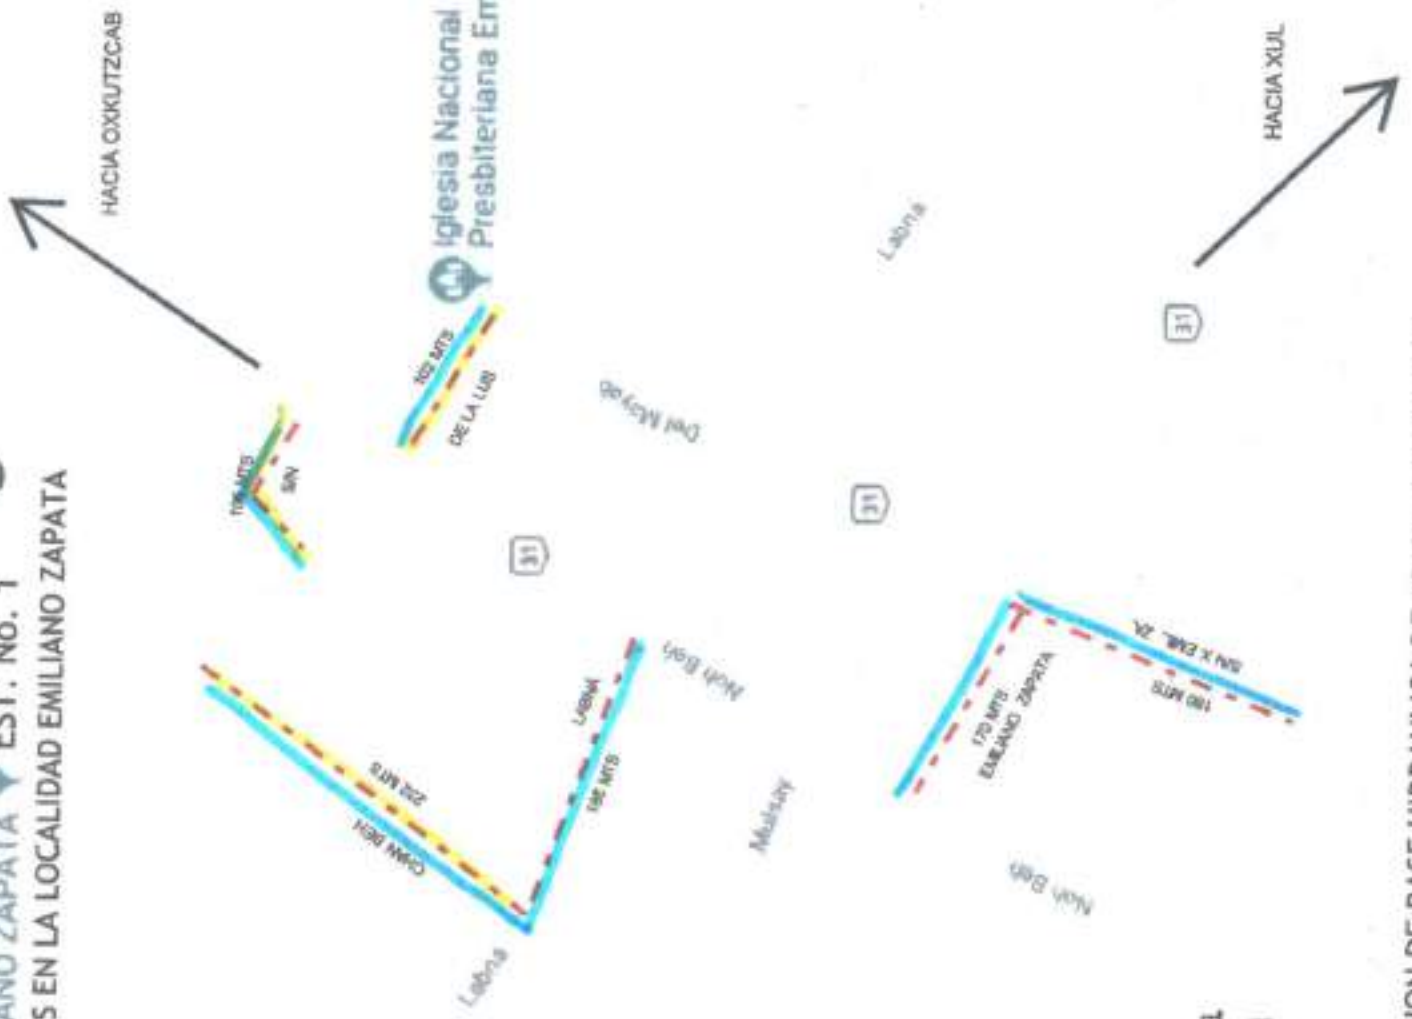

[Signature]

[Signature]

[Signature]


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ANTONIO ROMERO CHEL
 OXKUTZCAB, YUCATÁN
 MANEJO 2018-2021

 FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CM. DE ESPESOR
 FORMACION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 4 CM. DE ESPESOR


 OXKUTZCAB, YUCATÁN
 LOC. EMILIANO ZAPATA
