

# CONSTRUCCION EN OBRAS CIVILES Y SERVICIOS GENERALES

RFC emisor: SC1110605359	Folio fiscal: 7A1617BF-CE24-4CF4-9C0D-0DD70CC1CD91
Nombre emisor: SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	No. de serie del CSD: 09001000000413013557
Folio: 092	Código postal, fecha y hora de emisión: 97970 2019-07-01 12:05:10
RFC receptor: MOY8501019K3	Efecto de comprobante: Ingreso
Nombre receptor: MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN	Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: Gastos en general	

## Conceptos

Clave de producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de instrumento	No. de cuenta productiva								
72141104		1	E69	SERVICIO	440190.46	440190.46											
RECEBI DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN LA CANTIDAD \$ 510,620.93 ( QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 93/100. M.N.) POR PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 Y FINQUITO DE LOS TRABAJOS DE OBRA " REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE OBRERA " ZAPATA", SEGUN CONTRATO No. FISMDF-036-YUC-2019-LP07. IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 628,843.01 AMORTIZACION DE ANTICIPO \$ 188,853.05 SUBTOTAL \$ 440,190.46 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO \$ 70,430.47 SUBTOTAL \$ 510,620.93 RETENCION DEL 0.5% \$ 0.96 AL CANC. E LIQUIDO DE LA ESTIMACION \$ 510,620.93					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Impuesto</th> <th style="width: 15%;">Tipo</th> <th style="width: 15%;">Base</th> <th style="width: 15%;">Tipo Factor</th> <th style="width: 15%;">Tasa o Cuota</th> <th style="width: 15%;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IVA</td> <td>Traslado</td> <td style="text-align: right;">440190.46</td> <td>Tasa</td> <td style="text-align: right;">16.0000%</td> <td style="text-align: right;">70430.47</td> </tr> </tbody> </table>	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	IVA	Traslado	440190.46	Tasa	16.0000%	70430.47
Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe												
IVA	Traslado	440190.46	Tasa	16.0000%	70430.47												

Moneda: Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>	\$ 440,190.46
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	<b>Impuestos Traslados IVA 16.0000%</b>	\$ 70,430.47
Método de pago: Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>	\$ 510,620.93

### Sello digital del CFDI:

H2ST8wF5AQ7i7SADUvPWRawgDdGDuRhhYKzbtzWuhObGuM48hu+789QLwK0W13ZBdWDXV7B12GuJ550FBMVjgrMRZzolewRQJRePeYsCEGTjB7XarCVKQ1E4HYcZdHfFstrv+K98aBdgFvSEKcJnQONyW8Vv4eXgLSRGcD8H4VgwP9RZDyRReUosa7DGeK64PQ+7zEpo4r2EpdG2VUJFSMNR9H4e17y6saXhICh3PjUKTjpo4Y1wefqP38mgwH1dop3mKyYsaSdPdGnFIn8C2sbLXv6BNjQ7M95M01DNWAFAGp388T4NAKs8VmA==

### Sello digital del SAT:

EMwVdL8KPs8DXC27rCEvQwY63j13wvKbpt8uUvQWV1FuKEodDOU4eIPQEacIFo3EQSGHmLgvU4od0OCgVPAe1DuC28w8NCaW6AvVvVeFumpPXBOvg421EQnH+5GMMd9qjQ2xdsLVQRr+Nj+G8Ddvd8wG8LuzszGvmsWj9EFj1KPTuWLVj8LJ0k00derybNMbCKBwroC2ZXT7d9wKPMoMTvHqkaZqf75fP+Y17OyphH8mLyzshL0XT87aHjgvF8oz7mlr7Hv0WZ0G0U+voNkMh0Mk03NugJd5RopJcKONPXWmAEU003==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.17A1617BF-CE24-4CF4-9C0D-0DD70CC1CD91]2019-07-01T12:12:23[SAT]979701NN3jZST8wF5AQ7i7SADUvPWRawgDdGDuRhhYKzbtzWuhObGuM48hu+789QLwK0W13ZBdWDXV7B12GuJ550FBMVjgrMRZzolewRQJRePeYsCEGTjB7XarCVKQ1E4HYcZdHfFstrv+K98aBdgFvSEKcJnQONyW8Vv4eXgLSRGcD8H4VgwP9RZDyRReUosa7DGeK64PQ+7zEpo4r2EpdG2VUJFSMNR9H4e17y6saXhICh3PjUKTjpo4Y1wefqP38mgwH1dop3mKyYsaSdPdGnFIn8C2sbLXv6BNjQ7M95M01DNWAFAGp388T4NAKs8VmA==[09001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2019-07-01 12:12:23  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



PRESIDENTE MUNICIPAL  
 RAUL ANTONIO ROJAS  
 OXKUTZCAB, YUC.  
 EL AYUNTAMIENTO 2019-2021

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfid:Comprobante xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Folio="092" Fecha="2019-07-01T12:05:10"
Sello="hZST8mf5AQ7f78fAOUVpPWRawqDdGDufRbfyKzbxWubObGuMf48hu+7fRQLwskPw13ZBdlWEXVT9L2GuJSS0FBMVJjgrMRZaobwiefQJ6aPeYaf
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000413013557" SubTotal="440190.46"
Certificado="MIJGPeCCBCegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTMwMTMINTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BkMudIGRI
Moneda="MXN" Total="510620.93" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="97970" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfid:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV" Rfc="SCI10005359">
    <cfid:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE ONKUTZCAR, YUCATAN" Rfc="MOY0501019K2" UsoCFDI="G03">
      <cfid:Conceptos>
        <cfid:Concepto Importe="440190.46" ValorUnitario="440190.46" Descripcion="RECIBI DEL MUNICIPIO DE ONKUTZCAR, YUCATAN LA CANTIDAD
$ 510,620.93 ( QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 93/100 MN.) POR PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO DE
LOS TRABAJOS DE OBRA " REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA", SEGUN CONTRATO No.
FISMDF-ONK-YUC-2019-LP97, IMPORTE DE LA ESTIMACION $ 620,843.51 AMORTIZACION DE ANTICIPO $ 188,653.05 SUBTOTAL $
440,190.46 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 70,430.47 SUBTOTAL $ 510,620.93 RETENCION DEL 0.5% $ 0.00 ALCANCE LIQUIDO DE LA
ESTIMACION $ 510,620.93" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="72141104">
          <cfid:Impuestos>
            <cfid:Traslados>
              <cfid:Traslado Importe="70430.47" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="440190.46">
                <cfid:Traslados>
                  <cfid:Impuestos>
                    <cfid:Concepto>
                      <cfid:Conceptos>
                        <cfid:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="70430.47">
                          <cfid:Traslados>
                            <cfid:Traslado Importe="70430.47" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002">
                              <cfid:Traslados>
                                <cfid:Impuestos>
                                  <cfid:Complemento>
                                    <cfid:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="EMhWcl8KIPs8DXCd27uCEvQvuVh3jL3vuKb/pbaUlvQWVHfPkEdDOU4ofPQEaSHFvJEQ5GHmLgU4adGOCgVPAa1DuCZ6n
NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
SelloCFDI="hZST8mf5AQ7f78fAOUVpPWRawqDdGDufRbfyKzbxWubObGuMf48hu+7fRQLwskPw13ZBdlWEXVT9L2GuJSS0FBMVJjgrMRZa
RfcProvCertif="SAT979701NN3" FechaTimbrado="2019-07-01T12:12:13" UUID="7A1617BF-CE24-4CF4-9C0D-0DD70CC1CD91"
xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
                                  <cfid:Complementos>
                                </cfid:Complementos>
                              </cfid:Complemento>
                            </cfid:Impuestos>
                          </cfid:Traslados>
                        </cfid:Conceptos>
                      </cfid:Concepto>
                    </cfid:Impuestos>
                  </cfid:Traslados>
                </cfid:Traslados>
              </cfid:Traslados>
            </cfid:Impuestos>
          </cfid:Concepto>
        </cfid:Conceptos>
      </cfid:Conceptos>
    </cfid:Receptor>
  </cfid:Emisor>
</cfid:Comprobante>

```

PRESIDENTE MUNICIPAL  
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL  
ONKUTZCAR, YUCATAN  
EL AYUNTAMIENTO 2018-2021

# OPERADO FISM

**SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.**

CALLE 57 No. 145-B X 24 Y 26 COLONIA YOCCHENKAX, TEXKAX, YUCATAN,

**RESUMEN DE ESTIMACION**

HOJA : 1 DE 1

ESTIMACION No. : 02

CONTRATISTA : SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

DEPARTAMENTO :

PERIODO DEL : 04-Jun-2019 AL : 30-Jun-2019  
 CONTRATO No. : FISMIF-0XK-YUC-2019-LP/07  
 LOCALIDAD : E. SAPATA  
 MUNICIPIO : OXKUTZ'KAB  
 MONTO CONTRATADO : \$ 1,989,229.52

IMPORTE DE ESTIMACION : \$ 628,843.51  
 CERRA : CERRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA  
 FECHA INICIO DEL CONTRATO : 13-may-2019  
 FECHA TERMINO DEL CONTRATO : 10-ago-2019  
 ANTICIPO : \$ 514,620.93

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE ESTIMACION	SALDO X ESTIMAR	REDUCCIONES
01	PRELIMINARES	115,877.84	115,877.84	115,877.84	0.00	0.00	I.C.T.C. 0.00%
02	TERRACERIAS	170,101.43	170,101.43	170,101.43	0.00	0.00	OTRAS 0.00%
03	BASE HIDRAULICA	327,118.13	327,118.13	327,118.13	0.00	0.00	TOTAL 0.00%
04	SAQUEMOTOS	1,101,955.63	1,101,955.63	473,113.12	628,843.51	0.00	IMP. ESTIMACION: ANTICIPO: \$ 628,843.51
		<b>T O T A L E S</b>	<b>1,714,853.03</b>	<b>1,086,069.52</b>	<b>628,843.51</b>	<b>9.00</b>	<b>SUBTOTAL: \$ 446,180.46</b> <b>I.V.A: \$ 76,430.47</b> <b>IMPORTE NETO: \$ 516,620.93</b> <b>REDUCCION: \$ 0.00</b> <b>IMPORTE NETO: \$ 516,620.93</b>

IMPORTE LETRAS : (SON: QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 93/100 M.N.)

\$ 516,620.93

 Autoridad PRESIDENTE MUNICIPAL	Elaboró  Elaborador UNICO	Revisó  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
TEC. RAUL DOMINGO ROMERO CHEL C. UTMUNICION PUEBLO CANTABERRA ING. FIDELBERTO VARGUES CAUICHE		

**OPERADO FISM**

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PAUL ANTONIO ROMERO CHEL  
 OXKUTZ'KAB YUCATAN

**SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.**  
**CALLE 57 No. 145-B X 24 Y 26 COLONIA YOCCHENKAX, TEKAX, YUCATAN.**

ESTADO DE CUENTA HASTA LA ESTIMACIÓN NO. 02

PROGRAMA :	RAMO 33	CONTRATISTA :	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.		
LOCALIDAD :	M. SAPATA	CONTRATO :	FISMDF-GVK-YUC-2019-LP/07	FECHA :	10-may-2019
MUNICIPIO :	OXKUTACAN	FECHA DE INICIO :	13-may-2019	TERMINACIÓN :	10-ago-2019
OBRA :	OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO SAPATA. CONTRATO No.: FISMDF-GVK-YUC-2019-LP/07				
CONT. (I/IVA) :	EL 714,853.03	AMPLIACIÓN :	00.00	ANTICIPO :	8514,455.91

ESTADO DE CUENTA

HASTA LA ESTIMACIÓN NO. 03

FECHA : 30-jun-2019

IMPORTE DEL CONTRATO :	61,714,853.03
IMPORTE DE ESTIMACIONES ANTERIORES :	61,066,009.52
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN :	9628,843.51
SALDO	00.00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO :	
IMPORTE DEL ANTICIPO :	8514,455.91
AMORTIZADO ESTIMACIONES ANTERIORES :	8325,802.86
AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN :	2108,603.05
SALDO	00.00

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
 SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.  
 C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA

AUTORIZO

\_\_\_\_\_  
 TEC. PAUL ANTONIO ROMERO CHEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PAUL ANTONIO ROMERO CHEL  
 OXKUTZCAB YUCATAN  
 EL AYUNTAMIENTO 2018-2021

Vº. Bº.

\_\_\_\_\_  
 ING. FELICERTE VARGUES CANCHE  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**OPERADO FISM**

**SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.  
CONTROL FINANCIERO**

CONTRATO FISMDF-03X-YOC-2013-1P/07

ESTIMACIÓN: 02

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO SAPATA.  
CONTRATO No.: FISMDF-03X-YOC-2013-1P/07

FECHA DE ESTIMACION : 30-jun-2019

LOCALIDAD : E. SAPATA

PERIODO : 04-jun-2019 AL : 30-jun-2019

MUNICIPIO : OXKUTZ'AB

CONTRATISTA : SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

I M P O R T E S	L I Q U I D A C I O N ( \$ )	
VALOR DE LA ESTIMACIÓN		4628,843.51
35.00% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		1620,091.19
SUBTOTAL		6440,190.46
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		670,430.47
SUBTOTAL DEL VALOR DE LA ESTIMACIÓN		5510,620.93
RETENCIONES :		
0.004 I.C.I.C.:		\$0.00
0.004 DERECHO Y SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL:		\$0.00
0.004 OBRAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL:		\$0.00
SUBTOTAL RETENCIONES :		\$0.00
ALCANCE LIQUIDO DE LA ESTIMACIÓN		5510,620.93

A N T I C I P O	S/IVA	C/IVA
IMPORTE ANTICIPO	5514,455.91	6596,768.85
AMORTIZACIÓN ACUMULADO ANTERIOR	5325,802.86	6377,931.32
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	5168,653.05	6218,837.54
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	5514,455.91	6596,768.86
SALDO POR AMORTIZAR	\$0.00	\$0.00

ESTADO DE CUENTA + CONVENIO	S/IVA	C/IVA
IMPORTE ACTUAL CONTRATADO	51,714,853.03	61,989,229.52
ACUMULADO ANTERIOR	51,086,009.52	61,259,775.04
ESTA ESTIMACIÓN	4628,843.51	5729,458.47
ACUMULADO A LA FECHA	51,714,853.03	61,989,229.52
SALDO POR EJERCER	\$0.00	\$0.00

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 RAUL ANTONIO RIVERO CHEL  
 OXKUTZ'AB, YUCATÁN  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

**SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.**  
**CALLE 57 No. 145-B X 24 Y 26 COLONIA YOCCHENKAX, TEXKX, YUCATAM.**

**ESTIMACIÓN**

HOJA 4 DE 4

Estimación No. 1 02	FECHA: 30-jun-2019	DEL 06-jun-2018 AL 30-jun-2018	IMPORTE: 729,458.47
PROGRAMA: SAUC 33			
LOCALIDAD: E. SAPATA			
MUNICIPIO: OXTEPEC			
CONTRATO No.: FIBMF-00X-YUC-2019-JP/31			
OBRA: OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD BELLIANO SAPATA.			
CONTRATO: FIBMF-00X-YUC-2019-LP797		FECHA: 10-may-2019	TERMINACION: 10-ago-2019

CLAVE	CONCEPTO	PTE	DNI	EFECTO UNITARIO	PRESUPUESTO		VOLUMEN		IMPORTE ESTIMADO	
					ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL	EXCEDENTE		
<b>04</b>	<b>PAVIMENTOS</b>									
580013	FORMACION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO, UTILIZANDO MATERIALES DE 3/8 A FIBROS Y 4 CMS. DE ESPESOR CONTACTO, SE APLICARA RIEGO DE LIGUA A RAZON DE 1.00 L7/M2 CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE SERRAJANA AL 50% (85% EMULSION-20% AGUA) CURRIENDOSE CON UNA CAPA DE 3/8" APLICADO DE FORMA MANUAL (FORNO), DESPUES LA APLICACION DEBERA SER CON FAVINESTADORA (FINISHER) Y SE CONTINUARA EL PROCESO CON RODILLO L-290 CONTINUANDO EL PROCESO CON RODILLO NEUMATICO (SE FORMA ALTERNADA), INCLUYE: EQUIPO, MANEJERIA, TRANSPORTE DE LOS MATERIALES DE LA PLANTA HASTA LA OBRA Y VAGO DE OBRA, LIMPIEZA FINAL, DESALGOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE O NO UTILIZABLE ANTES DE ENTREGAR LA OBRA, SE DEBERA REALIZAR EN TODA EL AREA Y DESALGOJAR TODO EL MATERIAL SOBRAANTE FUERA DE LA OBRA.									
580066	RIEGO TAPON A BASE DE EMULSION SUPERESTABLE A RAZON DE 1.00 L7/M2, SERRAJANO AL 50% (85% EMULSION-10% AGUA), INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.									
					4,435.50	2,028.00	2,407.50	4,435.50	0.00	361,645.88
					4,435.50	0.00	4,435.50	4,435.50	0.00	14,592.80
					33.88	0.00	4,435.50	4,435.50	0.00	22,605.03
<b>TOTAL PAVIMENTOS</b>										
					<b>SUBTOTAL</b>				628,843.51	
					<b>16.00 % IVA</b>				106,518.96	
					<b>TOTAL ESTIMACION</b>				729,458.47	

Autuclis	Elaboró	Revisó
TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CUEL	C. ESTHER ROSA CASTAÑEDA	ING. WILBERTO VARGAS CAMUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL	ADMINISTRADOR UNICO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**ING. ANTONIO ROMERO CUEL**  
 OXKUTZUC, YUCATAM

**OPERADO FISM**

SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

FINQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA.  
 CONTRATO No.: FISMOP-008-2019-12/07

NO	CLAVE	DESCRIPCION	FE	UNID	VOL. CONSTR.	VAL. ESTIM.	VAL. E. BASE	VOL. RECOR.	IMP. CONSTR.	IMP. ESTIMADO	IMP. E. PROYECTADA	IMP. E. CONCRETADA
01		<b>PRELIMINARES</b>										
01	58010	ESTABILIZACION DE MOVIMIENTO DE SOL. ESTADO DE MAYA DE CMO. DE EQUIPAMIENTO, INCLUYE DESARROLLO DEL MATERIALS IDENTIFICABLES PARA LA OBRA, EQUIPOS, REPARACIONES Y MAQUINARIA.	ME		4,435.50000	4,435.5000	0.0000	0.0000	388,333.58	388,333.58	388,333.58	388,333.58
01	58012	REPARACIONES CON TRAZO Y RETRACCION EN CADA ETAPA DE LA CONSTRUCCION, INCLUYE REPARACIONES, MATERIAL DE CONCRETO, EQUIPOS, REPARACIONES Y MAQUINARIA.	ME		4,435.50000	4,435.5000	0.0000	0.0000	127,545.38	127,545.38	127,545.38	127,545.38
		<b>TERRACERIAS</b>										
02	51010	FORNACION DE TERRACERIAS COMPLEMENTADO CON MATERIAL PROYECTADO DE LA SACRIFICACION, INCLUYE: ALARABES, ENTUBIDO Y CONCRETO CON MOTOS MECANICOS, AFRECCION CON TMA Y ALARABES DE 1 CM, EQUIPOS, REPARACIONES Y MAQUINARIA.	ME		4,435.50000	4,435.5000	0.0000	0.0000	815,877.84	815,877.84	815,877.84	815,877.84
		<b>BASE HIDRAULICA</b>										
03	51012	FORNACION DE LA BASE HIDRAULICA DE 12 CM. DE ESPESOR CONCRETO CON MATERIAL DE SACRIFICACION DE 5 A 12 CM, ENTUBIDO Y CONCRETO AL 10% INCLUYE EQUIPOS, MAQUINARIA Y MATERIALS IDENTIFICABLES EN EL SITIO DE TRABAJO.	ME		4,435.50000	4,435.5000	0.0000	0.0000	227,118.13	227,118.13	227,118.13	227,118.13
		<b>TOTAL PRELIMINARES</b>										
		<b>TOTAL TERRACERIAS</b>										
		<b>TOTAL BASE HIDRAULICA</b>										

  
  
  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PAUL ANTONIO ROMERO CHEL  
 CONCEJALAS YUCALES  
 EL AYUNTAMIENTO 2016-2021

FIR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA.  
 CONTRATO No.: FIMOP-03X-10C-2019-LB/07

04	05	CANT	DESCRIPCION	PIE	VAL. CONTR.	VAL. RETEN.	VAL. F. REC.	F. OBTENCION	IMP. CONTRAT.	IMP. ESTIMADO	IMP. F. FINIQUITA	IMP. REVERTIBLE	
			<b>PAVIMENTOS</b>										
6)	24000		FORMACION DE CARRETA ASFALTADA DE PISO, UTILIZANDO MATERIAS DE 1/4 A FINO Y 4 CM. DE ESPESOR CONTRACTO, SE APLICARA RIEZO DE LIGA A RAZON DE 1.10 L/CMO CON EMULSION CATIONICA SUFICIENTE PARA LLEVAR AL 100% (80% EMULSION-20% AGUA) CUBIERTOS CON UNA CAPA DE 1/2" APLICADO EN FORMA MANUAL (PORREO), DESPUES LA APLICACION DEBERA SER CON FORTIFICACION (FIBRAS) Y SE CONTINUARA EL PROCESO CON RIEZO LIGO CONTINUO EL PROCESO CON RIEZO MANEJADO (SE FORMA ALTERNADA). INCLUYE: DOTAPA, DEMARCACION, TRANSFERENCIA DE LOS MATERIALES DE LA PLANTA HASTA LA OBRA Y MANEJO DE LOS MATERIALES EN EL SITIO DE LA OBRA. SE INCLUIRAN EL RIEZO VIBRO Y RIEZO DE EMULSION SUFICIENTE A RAZON DE 1.10 L/CMO, MANEJO AL 100% (80% EMULSION-20% AGUA) CANTIDAD LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.	46	6,419,600000	4,433,5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7)	24004		CONFICION FIBRA, EMULSION DEL MATERIAL EXISTENTE O NO UTILIZABLE ANTES DE DESMOLDAR LA OBRA, SE DEBERA SOLICITAR DE TODA LA OBRA Y DESMOLDAR TODO EL MATERIAL DONDE FUERA DE LA OBRA.	15	6,413,600000	4,433,5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
				80	6,413,600000	4,433,5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
TOTAL PROYECTIVO										0.0000	0.0000	0.0000	
TOTAL										0.0000	0.0000	0.0000	
TOTAL										0.0000	0.0000	0.0000	
TOTAL										0.0000	0.0000	0.0000	

  
  
  
  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 EMILIANO ZAPATA, QUERÉTARO  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021



SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.  
 CALLE 57 X 24 Y 26 No. EXTERIOR 145 B COLONIA YOCHEWAX, LOCALIDAD TEKAX, MUNICIPIO DE TEKAX,  
 YUCATAN.

**NÚMEROS GENERADORES**

OBRAS: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EHLIAMO ZAPATA.  
 CONTRATO No.: FISHDF-OKR-YUC-2019-1P/07

Periodo : DEL 04/jun/2019 AL 30/jun/2019

Est	Lugar	Eje	Tramo	Largo	Ancho	Alto	Peso	Piezas	Volumen	Observaciones
04		PAVIMENTO								
580012		FORMACION DE CORRETA ASPALTICA EN FRIO, UTILIZANDO MATERIALES DE 3/8 A FIBRO Y 4 CMS; DE ESPESOR CORRENTO, SE APLICARA RIEGO DE LIGA A RAZON DE 1.00 L7/M2 CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE SENSADA AL 80% (80% EMULSION-20% AGUA) CUBRIENDOSE CON UNA CAPA DE 3/8" APLICADO DE FORMA MANUAL (FORRO). DESPUES LA APLICACION DEBERA SER CON PAVIMENTADORA (FINISER) Y SE CONTINUANDO EL PROCESO CON RODILLO LISO CONTINUANDO EL PROCESO CON RODILLO NEUMATICO (DE FORMA ALTERNADA), INCLUYE: EQUINO, BOMBAMIENTA, TRANSPORTE DE LOS MATERIALES DE LA PLANTA HASTA LA OBRA Y MANO DE OBRA.								
02	C. LABVA	CRIBRE	BORRCH	174.00	4.50			1	753.0000	MG
02	C. E. ZAPATA	8/8	DEL MA	168.00	4.50			1	756.0000	
02	C. 8/8	E. ZAPAT		135.00	4.80			1	607.5000	
02	C. METSAY			88.00	4.50			1	261.0000	
									<b>2,407.5000</b>	<b>MG</b>
									<b>2,407.5000</b>	<b>MG</b>
580006		BLOQUE TAPON A BASE DE EMULSION SUPERESTABLE A RAZON DE 1.00 L7/M2, REBAJADO AL 70% (70% EMULSION-30% AGUA), INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.								
									<b>580012</b>	<b>LT</b>
02	C/N	C- DE LU	Y BORRCH	96.00	4.50			1	439.0000	
02	C. DE LIS	BORRCH	Y C. DEL	102.00	4.50			1	459.0000	
02	C. CHAN BEH	C. LABVA	BORRCH	228.00	4.50			1	1,026.0000	
02	C. LABVA	CRIBRE	BORRCH	174.00	4.50			1	783.0000	
02	C. E. ZAPATA	8/8	DEL MA	148.00	4.50			1	756.0000	
02	C. 8/8	E. ZAPAT		135.00	4.50			1	607.5000	
02	C. METSAY			69.77778	4.50			1	314.0000	
									<b>4,435.5000</b>	<b>LT</b>
									<b>4,435.5000</b>	<b>LT</b>



REGISTRO MUNICIPAL  
 FUNDACION CASANO CHEL  
 YUCATAN  
 MAR 2019

*[Signature]*

*[Signature]*

CALLE 57 X 24 Y 26 NO. EXTERIOR 145 B COLONIA YOCHEKAK, LOCALIDAD TEKAX, MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN.  
**SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.**

**NÚMEROS GENERADORES**

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD ENTILIANO ZAPATA.  
 CONTRATO No.: FISMDF-OMK-YUC-2019-LP/07

Periodo : DEL 04/Jun/2019 AL 30/Jun/2019

Ord	Logar	Eje	Tramo	Largo	Ancho	Alto	Peso	Volumen	Observaciones
04	ZAVISEPTOR								
550000	LIMPIEZA FINAL, DESGLOSE DEL MATERIAL EXCEDENTE O NO UTILIZABLE ANTES DE EFECTUAR LA OBRA, SE DEBERÁ REALIZAR EN TODA EL AREA Y DESALOJAR TODO EL MATERIAL SOBRAANTE FUERA DE LA MISMA.								
Frente									
02	C/8	C- DE 10	Y NOROCC	99.00	5.00		1	490.5000	
02	C. DE 105	NOROCC	Y C. DEL	102.00	4.50		1	459.0000	
02	C. CHAN BEH	C. LABNA	NOROCC	228.00	4.50		1	1,026.0000	
02	C. LABNA	CHAMBE	NOROCC	174.00	4.50		1	783.0000	
02	C. E. ZARITA	S/8	DEL MA	168.00	4.50		1	756.0000	
02	C. S/8	E. ZARIT		235.00	4.50		1	607.5000	
02	C. MULARY			69.9778	4.50		1	314.6600	
<b>Total Frente</b>							<b>580000</b>	<b>4,435.5000</b>	<b>MD</b>
<b>Total Concepto</b>							<b>580000</b>	<b>4,435.5000</b>	<b>MD</b>



PRESIDENTE DISTRITO: EL  
 RAUL ANTONIO ROSAS DE GEL  
 OCAUTOCHE YUCATÁN  
 EL AYUNTAMIENTO 2018-2021

# REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA

NO. CONTRATO: FISMDF-0XK-YUC-2019-LP/07

CONTRATISTA: SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

ESTIMACION 2



PRESIDENTE MUNICIPAL  
PAUL ANTONIO PEÑERO CHEL  
OKUKTZ'AB, YUCATÁN  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021



# REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA

NO. CONTRATO: FISMDF-0XK-YUC-2019-LP/07

CONTRATISTA: SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

ESTIMACION 2



A handwritten signature or mark consisting of a circle with an 'X' inside.



PRESIDENTE MUNICIPAL  
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL  
OXKUTZCAB, YUCATÁN  
EL QUINTA BIENIO 2018-2021

A handwritten signature in black ink.

# REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA

NO. CONTRATO: FISMDF-0XK-YUC-2019-LP/07

CONTRATISTA: SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

ESTIMACION 2



PRESIDENTE MUNICIPAL  
PAUL ANTONIO ROMERO CHEL  
OXKUTZCAB, YUCATÁN  
M. AYUNTAMIENTO 2016-2021

# REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA

NO. CONTRATO: FISMDF-0XK-YUC-2019-LP/07

CONTRATISTA: SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

ESTIMACION 2



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the contractor, is written over the bottom right corner of the page.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the municipal president, is written in the lower right area of the page.

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL  
CIRKUTZ'AE YUCATAN  
EL AYUNTAMIENTO 2018-2021

# REPORTE FOTOGRAFICO

**OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA**

**NO. CONTRATO: FISMDF-0XK-YUC-2019-LP/07**

**CONTRATISTA: SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.**

**ESTIMACION 2**



PRESIDENTE MUNICIPAL  
PAUL ANTONIO ROMERO CHEL  
OXKUTZCAB, YUCATÁN  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

# REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA

NO. CONTRATO: FIS MDF-0XK-YUC-2019-LP/07

CONTRATISTA: SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

ESTIMACION 2



PRESIDENTE MUNICIPAL  
RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL  
COXUTZ'COB, YUCATÁN  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021



# REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA

NO. CONTRATO: FISMDF-0XK-YUC-2019-LP/07

CONTRATISTA: SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

ESTIMACION 2



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom left of the page.

An official stamp of the Municipal President of Oxtepecab, Yucatán, for the 2018-2021 term. The stamp features the coat of arms of the state of Yucatán and the text: PRESIDENTE MUNICIPAL PAUL ANTONIO RICHARDO CHEL OXTEPECAB, YUCATÁN H. AYUNTAMIENTO 2018-2021.

A handwritten signature in blue ink, located at the top right of the page.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

# REPORTE FOTOGRAFICO

**OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA**

**NO. CONTRATO: FISMDF-0XK-YUC-2019-LP/07**

**CONTRATISTA: SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.**

ESTIMACION 2



A large, stylized handwritten signature in black ink.



PRESIDENTE MUNICIPAL  
RAFA ANTONIO RICMERO CHEL  
OXKUTZ'AB, YUCATAN  
PLAZA GOBIERNO 2018-2021

A smaller handwritten signature in black ink, located below the official seal.



### BITACORA DE OBRA

ESTIMACIÓN No. 02

CONTRATO No. FISDMF-OXK-YUC-2019-LP/07

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA

CONTRATISTA: SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

NOTA#07 FECHA 08/06/2019	CON ESTA FECHA DE NOTIFICA A LA SUPERVISION DEL MUNICIPIO SE CONTINUA CON EL BARRIDO DE LA BASE HIDRAULICA PARA LA APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA PARA LUEGO LA APLICACIÓN DEL POREO DE FORMA MANUAL PARA SU POSTERIOR TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 4 CM. DE ESPESOR Y FINALMENTE LA APLICACIÓN DE RIEGO TAPON A BASE DE EMULSION SUPERESTABLE A RAZON DE 1.00 LT/M2.
FIRMA  POR LA EMPRESA CONTRATISTA ING. REY DAVID EHUAN ARÉVALO	FIRMA  POR LA SUPERVISIÓN ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE

NOTA#08 FECHA 10/06/2019	CON ESTA FECHA DE NOTIFICA A LA SUPERVISION DEL MUNICIPIO SE CONTINUA CON EL BARRIDO DE LA BASE HIDRAULICA PARA LA APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA PARA LUEGO LA APLICACIÓN DEL POREO DE FORMA MANUAL PARA SU POSTERIOR TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 4 CM. DE ESPESOR Y FINALMENTE LA APLICACIÓN DE RIEGO TAPON A BASE DE EMULSION SUPERESTABLE A RAZON DE 1.00 LT/M2.
FIRMA  POR LA EMPRESA CONTRATISTA ING. REY DAVID EHUAN ARÉVALO	FIRMA  POR LA SUPERVISIÓN ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE

NOTA#09 FECHA 17/06/2019	CON ESTA FECHA DE NOTIFICA A LA SUPERVISION DEL MUNICIPIO SE CONTINUA CON EL BARRIDO DE LA BASE HIDRAULICA PARA LA APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA PARA LUEGO LA APLICACIÓN DEL POREO DE FORMA MANUAL PARA SU POSTERIOR TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 4 CM. DE ESPESOR Y FINALMENTE LA APLICACIÓN DE RIEGO TAPON A BASE DE EMULSION SUPERESTABLE A RAZON DE 1.00 LT/M2.
--------------------------------	---



PRESIDENTE MUNICIPAL  
PAUL ANTONIO FIGUEROA CHEL  
CAHUTZEBAL YUCATÁN  
M. AYUNTAMIENTO 2018-2021





**BITACORA DE OBRA**

ESTIMACIÓN No. 02



CONTRATO No. FISMDF-OXK-YUC-2019-LP/07

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA



CONTRATISTA: SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

<p>FIRMA</p>  <hr/> <p>POR LA EMPRESA CONTRATISTA ING. REY DAVID EHUAN ARÉVALO</p>	<p>FIRMA</p>  <hr/> <p>POR LA SUPERVISIÓN ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE</p>
---	---

<p>NOTA#10 FECHA 24/06/2019</p>	<p>CON ESTA FECHA DE NOTIFICA A LA SUPERVISION DEL MUNICIPIO SE CONTINUA CON EL BARRIDO DE LA BASE HIDRAULICA PARA LA APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA PARA LUEGO LA APLICACIÓN DEL POREO DE FORMA MANUAL PARA SU POSTERIOR TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 4 CM. DE ESPESOR Y FINALMENTE LA APLICACIÓN DE RIEGO TAPON A BASE DE EMULSION SUPERESTABLE A RAZON DE 1.00 LT/M2.</p>
---	--

<p>FIRMA</p>  <hr/> <p>POR LA EMPRESA CONTRATISTA ING. REY DAVID EHUAN ARÉVALO</p>	<p>FIRMA</p>  <hr/> <p>POR LA SUPERVISIÓN ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE</p>
---	---

<p>NOTA#11 FECHA 29/06/2019</p>	<p>CON ESTA FECHA DE NOTIFICA A LA SUPERVISION DEL MUNICIPIO SE CONCLUYE CON EL BARRIDO DE LA BASE HIDRAULICA PARA LA APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA PARA LUEGO LA APLICACIÓN DEL POREO DE FORMA MANUAL PARA SU POSTERIOR TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 4 CM. DE ESPESOR Y FINALMENTE LA APLICACIÓN DE RIEGO TAPON A BASE DE EMULSION SUPERESTABLE A RAZON DE 1.00 LT/M2, SE REALIZA LIMPIEZAL DESALOJANDO MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA.</p>
---	--

<p>FIRMA</p>  <hr/> <p>POR LA EMPRESA CONTRATISTA ING. REY DAVID EHUAN ARÉVALO</p>	<p>FIRMA</p>  <hr/> <p>POR LA SUPERVISIÓN ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE</p>
---	---

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PAUL ANTONIO ROMERO CHEL  
OIXUTZ'AB, YUCATÁN  
II. AJUNTAMIENTO 2018-2021




### BITACORA DE OBRA

ESTIMACIÓN No. 02

CONTRATO No. FISMDF-OXK-YUC-2019-LP/07

OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA

CONTRATISTA: SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

NOTA#12 FECHA 30/06/2019	CON ESTA FECHA DE NOTIFICA A LA SUPERVISION DEL MUNICIPIO SE CONCLUYE LA LIMPIEZAL DESALOJANDO MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA, CON ESTE EVENTO SE CONCLUYE AL 100% LOS VOLUMENES DE DICHO CONTRATO Y SE REALIZA EL CIERRE DE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA.
FIRMA  POR LA EMPRESA CONTRATISTA ING. REY DAVID EHUAN ARÉVALO	FIRMA  POR LA SUPERVISIÓN ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE




PRESIDENTE MUNICIPAL  
PAUL ANTONIO ROMERO CHEL  
COXTLEPEC, YUCATÁN  
MAYUNTE 2019

**SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V.**

**EMILIANO ZAPATA EST.2**

**OBRA: REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA**

HACIA OXKUTZCAB

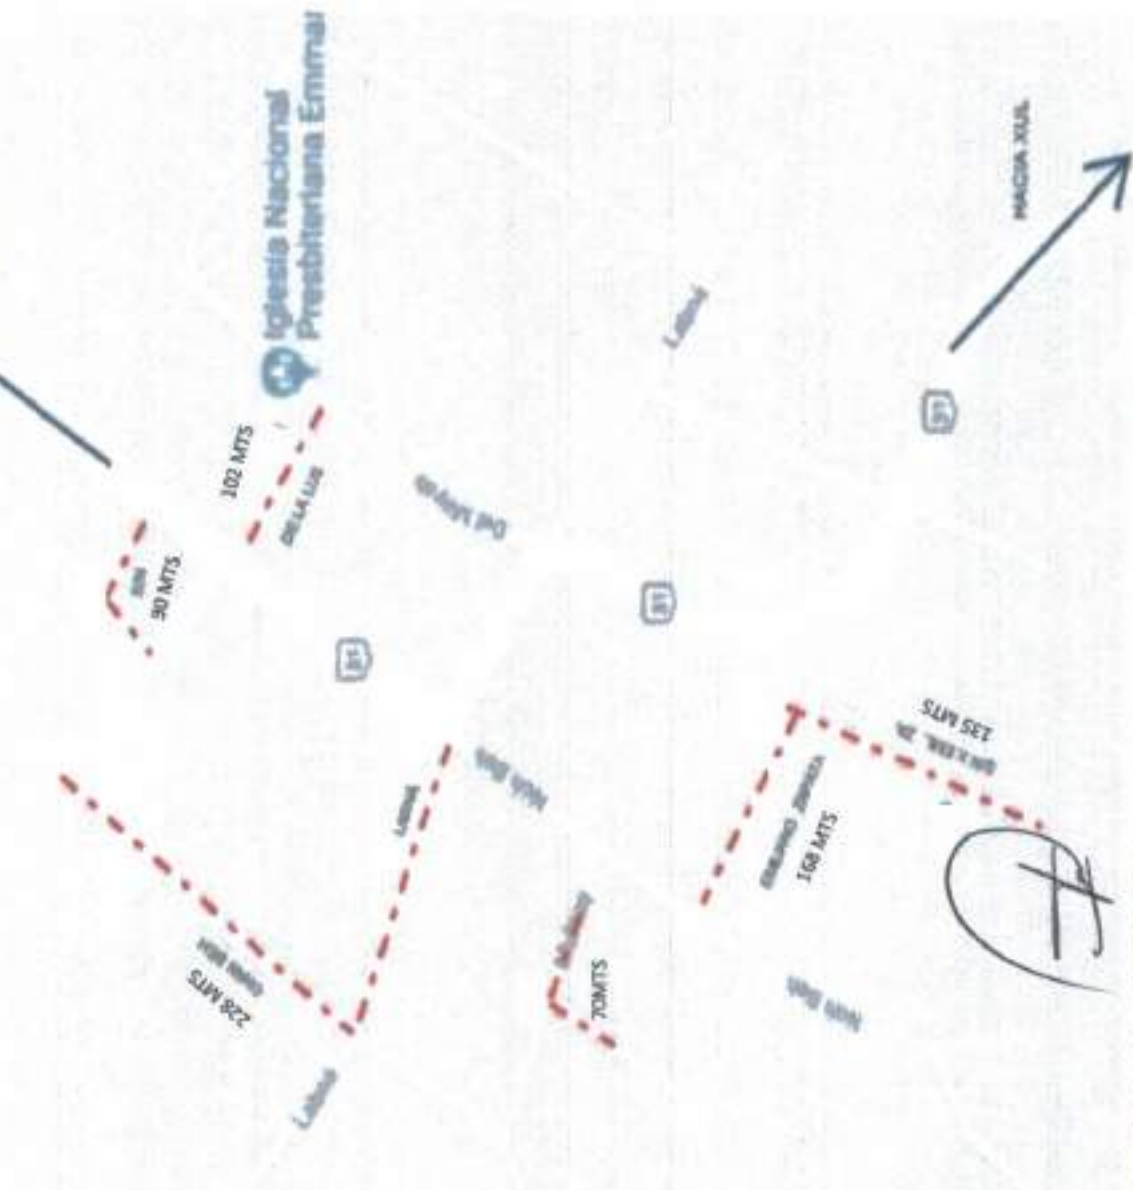

HACIA XUL



PRESIDENTE MUNICIPAL  
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL  
OXKUTZCAB, YUCATÁN  
H. AGOSTO 2016-2021

*[Signature]*

OXKUTZCAB, YUCATÁN  
LÓC. EMILIANO ZAPATA

FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CM. DE ESPESOR  
FORMACION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 4 CM. DE ESPESOR
