

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
2018 - 2021**

13-jun-2019

ESTIMACION No. : 01

Página : 1

ESTIMACION No. 01 DE FECHA : 13-jun-2019 DEL : 13-may-2019 AL : 13-jun-2019 IMPORTE :	789,395.18
PROGRAMA : YUCATAN	CONTRATISTA : MC y MV SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V.
LOCALIDAD : YAAXHACHEN MUNICIPIO : OXKUTZCAB	CONTRATO : FISMOP-OXK-VUC-2019-LP/08 FECHA : 10-may-2019
NOMBRE DE LA OBRA : OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN YAKHACHEN, YUCATAN.	FECHA DE INICIO: 13-may-2019 TERMINACIÓN : 10-ago-2019
Monto del Contrato : 1,935,436.13 Ampliación : 0.00	Anticipo : 580,630.96
	Monto Total d/Obra : 1,935,436.13

PARTIDA T/O PAQUETE NÚMERO DESCRIPCIÓN	C A N T I D A D D E O B R A S					PUNIT	IMPORTE
	FTE	OWI	SEG.PRESUP	ACUM.TOTAL	ACUM.ANT.		

1-02 CONSTRUCCION DE CALLES NUEVAS C-1, C-4,

SPRELI1	TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO, TOPOGRAFIA, Y LIMPIEZA INICIAL, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M2	2,710.350	2,710.350	0.000	2,710.350	18.62	50,466.72
SCORTEC	CORTE EN MATERIAL TIPO "C" CON LA MAQUINARIA ADECUADA PARA ALCANZAR LOS NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA , MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M3	284.000	284.000	0.000	284.000	531.30	150,889.20
SCATER03	FORMACION DE TERRACERIAS EN UNA SOLA CAPA COMPACTADO AL 90 % . INCL. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y ACOMPLETANDO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTABLE DE 0" A 3" TENDIDO CON MEDIOS MECANICOS. Y AFINADO HASTA ALCANZAR LOS NIVELES DE PROYECTO , COMPACTADO AL 90% RECOMENDABLE SEGUN EL MATERIAL UTILIZADO	M2	2,710.350	2,710.350	0.000	2,710.350	80.40	217,913.14
SCAPABAS	CONSTRUCCION DE CAPA BASE DE 12 CMS DE ESPESOR COMPACTO (SABHCB) DE 0 A 3" CONFORMADA CON MEDIOS MECANICOS REVUELTA ENSECO, HUMEDECIDA Y TENDIDA COMPACTADA AL 90% A HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL SANACAB , TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL	M2	2,710.350	2,710.350	0.000	2,710.350	78.57	212,952.20
	TOTAL CONSTRUCCION DE CALLES NUEVAS C-1, C-4,							632,220.26

1-03 REHABILITACION DE CALLES C-2, C-3

SPRELI1	TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO, TOPOGRAFIA, Y LIMPIEZA INICIAL, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M2	1,077.500	1,077.500	0.000	1,077.500	18.62	20,063.05
SESCARPA	ESCARIFICADO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN MAL ESTADO, DE HASTA 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE ACABELLONADO DEL MATERIAL.	M2	1,077.500	1,077.500	0.000	1,077.500	48.68	52,452.70
SCAPABAS	CONSTRUCCION DE CAPA BASE DE 12 CMS DE ESPESOR COMPACTO (SABHCB) DE 0 A 3" CONFORMADA CON MEDIOS MECANICOS REVUELTA ENSECO, HUMEDECIDA Y TENDIDA COMPACTADA AL 90% A HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL SANACAB , TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL	M2	1,077.500	1,077.500	0.000	1,077.500	78.57	84,659.19
	TOTAL REHABILITACION DE CALLES C-2, C-3							157,174.93

SUBTOTAL 789,395.19



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATAN
M. AYUNTAMIENTO 2018-2021

OPERADO FISM.

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
2018 - 2021**

13-jun-2019

ESTIMACION No. : 01

Página : 2

ESTIMACION No. 01 DE FECHA : 13-jun-2019 DEL : 13-may-2019 AL : 13-jun-2019 IMPORTE :	789,395.18
PROGRAMA : YUCATAN	CONTRATISTA : BC y MV SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V.
LOCALIDAD : YAAXHACHEN MUNICIPIO : OXKUTZCAB	CONTRATO : FISMDF-OXE-YUC-2019-LP/08 FECHA : 10-may-2019
NOMBRE DE LA OBRA : OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES EN YAAXHACHEN, YUCATAN.	FECHA DE INICIO: 13-may-2019 TERMINACION : 10-ago-2019
Monto del Contrato : 1,935,436.13 Ampliación : 0.00	Anticipo : 580,630.96
	Monto Total d/Obra : 1,935,436.13
PARTIDA Y/O PAQUETE	CANTIDAD DE OBRA
NÚMERO DESCRIPCIÓN	FTE UNI SEQ.PRESOP ACUM.TOTAL ACUM.ANT. ESTIMACION FONIT IMPORTE
	TOTAL ESTIMACION 789,395.18




PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO RIVERA CHEL
OXKUTZCAB, YUCATAN
EL AYUNTAMIENTO 2018-2021

ING. FILIBERTO VARELA CANCHE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE
OXKUTZCAB, YUCATAN.

C. CARLOS HERRERA VITE

BC y MV SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE

OPERADO FISM

BC y MV SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V.
MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
CONTROL FINANCIERO

CONTRATO : FISMDF-OKK-YUC-2019-LP/08

ESTIMACIÓN: 01

OBRA : OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN YAXNACHEN, YUCATAN.

FECHA DE ESTIMACION : 13-jun-2019

LOCALIDAD : YAXNACHEN

PERIODO : 13-may-2019 AL : 13-jun-2019

MUNICIPIO : OXKUTZCAB

CONTRATISTA : BC y MV SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V.

I M P O R T E S	L I Q U I D A C I O N (\$)
VALOR DE LA ESTIMACIÓN	0789,395.19
30.00% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0236,818.56
SUBTOTAL	0552,576.63
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	000,412.24
SUBTOTAL DEL VALOR DE LA ESTIMACIÓN	0640,988.89
RETENCIONES :	
0.00% I.C.I.C.:	00.00
0.00% DERECHO Y SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL:	00.00
0.00% OBRAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL:	00.00
SUBTOTAL RETENCIONES :	00.00
ALCANCE LIQUIDO DE LA ESTIMACIÓN	0640,988.89

A N T I C I P O	S/IVA	C/IVA
IMPORTE ANTICIPO	0500,543.83	0580,630.96
AMORTIZACIÓN ACUMULADO ANTERIOR	00.00	00.00
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	0236,818.56	0274,709.53
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	0236,818.56	0274,709.53
SALDO POR AMORTIZAR	0253,725.27	0305,921.42

ESTADO DE CUENTA + CONVENIO	S/IVA	C/IVA
IMPORTE ACTUAL CONTRATADO	01,668,479.42	01,935,436.13
ACUMULADO ANTERIOR	00.00	00.00
ESTA ESTIMACIÓN:	0789,395.19	0915,698.42
ACUMULADO A LA FECHA	0789,395.19	0915,698.42
SALDO POR EJERCER	0879,084.23	01,019,737.71

ING. FILIBERTO VARGAS PINCHE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN.

CARLOS RICO HERNANDEZ VITA

BC y MV SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE



PRESIDENTE MUNICIPAL
 PAUL ANTONIO ROMERO CHEL
 OXKUTZCAB, YUCATAN
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

OPERADO FISM

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB

2018 - 2021

11-jun-2019

Resumen de Estimación # 01

Página : 1

ESTIMACION No. 01 DE FECHA : 11-jun-2019 DEL : 13-may-2019 AL : 13-jun-2019 IMPORTE : \$ 915,698.42
 PROGRAMA : YUCATAN CONTRATISTA : SC y MV SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V.
 CONTRATO : FISMDF-ONX-160-2018-LP/08 FECHA : 10-may-2019
 LOCALIDAD : YAABACHEN MUNICIPIO : OXKUTZCAB FECHA DE INICIO: 13-may-2018 TERMINACIÓN : 10-ago-2019
 Monto del Contrato : \$ 1,935,436.13 Ampliación : 0 0.00 Monto Total d/Obras : \$ 1,935,436.13
 Anticipo : \$ 580,630.96
 NOMBRE DE LA OBRA :
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN YABACHEN, YUCATAN.

RECIBIMOS DE LA: MUNICIPIO DE OXKUTZCAB LA CANTIDAD DE :
 (NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.) \$15,698.42

R.F.C. S.P.P. BARRERAS C.M.T.C. CED. EMP. I.N.S.S. INPCNAVIT PADRON G.E.

ESTADO ESTIMACIONES

PARTIDA DESCRIPCION	IMP. ESTIMACION\$	IMP. ANTERIORS	IMP. ACUMULADOS	MONTO TOTAL\$	S A L D O\$
1-02 CONSTRUCCION DE CALLES NUEVAS C-1, C-4,	632,220.26	0.00	632,220.26	1,281,238.29	629,018.03
1-03 REHABILITACION DE CALLES C-2, C-3	157,174.93	0.00	157,174.93	407,341.13	250,066.20
SUB-T O T A L E S	789,395.19	0.00	789,395.19	1,688,479.42	879,084.23
16.00% DE I.V.A.	126,303.23	0.00	126,303.23	266,956.71	140,653.48
T O T A L E S	915,698.42	0.00	915,698.42	1,935,436.13	1,019,737.71

Elaboró:

 SC y MV SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V.
 C. CARLOS HUGO MENENDEZ VITE

ING. FILIBERTO VARGAS CANCHE

 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN.



 PRESIDENTE MUNICIPAL
 RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
 OXKUTZCAB, YUCATAN
 EL AYUNTAMIENTO 2018-2021

OPERADO FISM

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
2018 - 2021

ESTADO DE CUENTA HASTA LA ESTIMACIÓN NO. 01

PROGRAMA : YUCATAN
LOCALIDAD : YAAXHACHEN
MUNICIPIO : OXKUTZCAB
OSRA : OSRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN YAAXHACHEN, YUCATAN.
CONTRATISTA : BC y MV SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V.
CONTRATO : FISMDF-OOX-YUC-2019-LP/08
FECHA DE INICIO : 13-may-2019
FECHA : 10-may-2019
TERMINACIÓN : 10-ago-2019
CONT. (S/IVA) : \$1,935,436.13 AMPLIACIÓN : \$0.00 ANTICIPO : \$580,630.96

ESTADO DE CUENTA
HASTA LA ESTIMACIÓN NO. 01
FECHA : 13-jun-2019

IMPORTE DEL CONTRATO :	\$1,935,436.13
IMPORTE DE ESTIMACIONES ANTERIORES :	\$0.00
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN :	\$789,395.19
SALDO	\$1,146,040.94
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO :	
IMPORTE DEL ANTICIPO :	\$580,630.96
AMORTIZADO ESTIMACIONES ANTERIORES :	\$0.00
AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN :	\$236,818.56
SALDO	\$343,812.40

ING. FILIBERTO VARGAS CANCHE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
OXKUTZCAB, YUCATAN.

ATEXTAMENTE

BC y MV SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V.


C. CARLOS HUGO MENENDEZ VIDE



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATAN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

OPERADO FISM

YAXHACHEN, MPIO. DE OXKUTZCAB

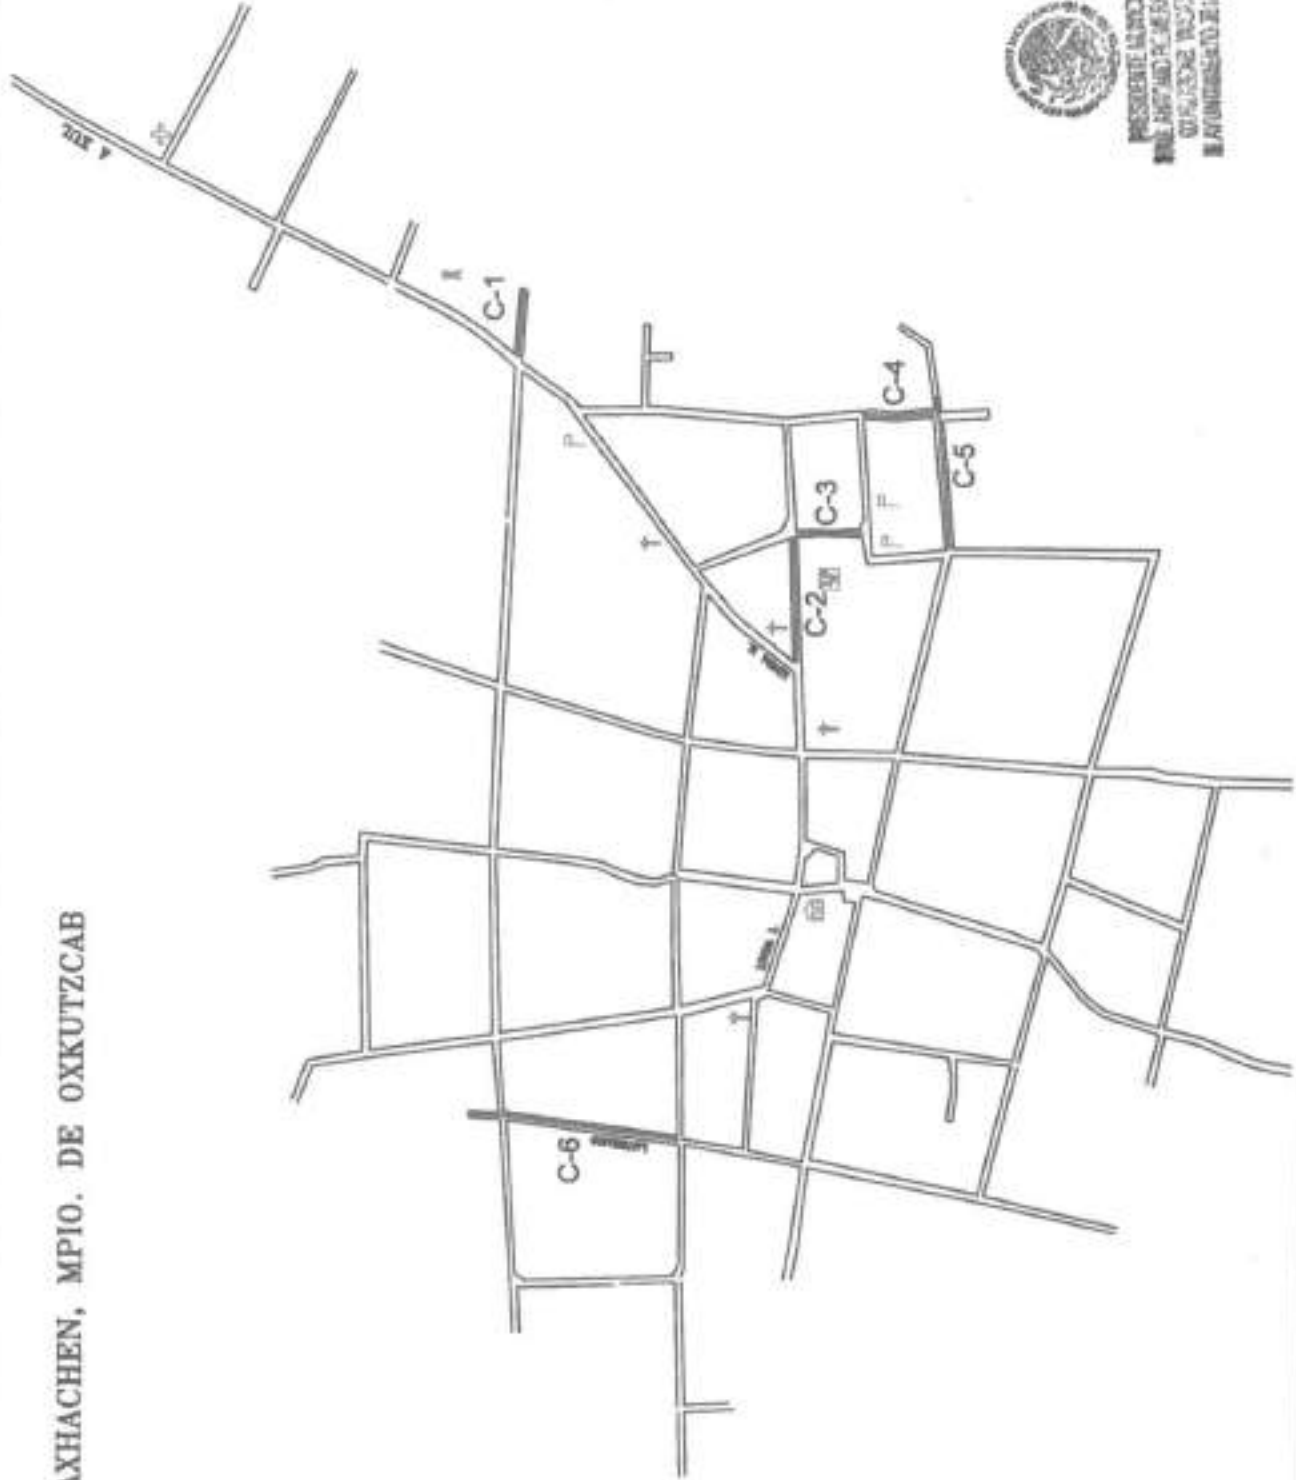

PRESENTE NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
MEXICO, D.F. 06702
MAY 14 2021

NORTE



OXKUTZCAB

MUNICIPIO DE
OXKUTZCAB
H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

UBICACION

CONSTRUCCION DE CALLES
EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHEN
MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN

PLANO DE

UBICACION DE CALLES

FECHA:

FEBRERO DE 2019

ESCALA:

SEN ESCALA

ADQUISICION

EN METROS

Nº DE PLANO

1/1

NÚMEROS GENERADORES

OX01 LICITACION: FISMOP-OKK-YUC-2019-LP/08
 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES EN YAXHACHEN

Est	Lugar	Eje	Tramo	Largo	Ancho	Alto	Peso	Piezas	Volumen	Observaciones
1-02	SPRUELI	CONSTRUCCION DE CALLES BAYAS C-1, C-4,								
	Fronte	TRABAJOS PRELIMINARES, TALLO, TOPOGRAFIA, Y LINDEREA INICIAL, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.								
	C-1			97.50	4.50			1	438.7500	
	C-4			74.50	4.50			1	335.2500	
	C-5			159.30	4.50			1	716.8500	
	C-6			271.00	4.50			1	1,219.5000	
								Total Frente	2,710.3500	M2
								Total Concepto	2,710.3500	M2
								SCORTEC		
	Fronte	CORTE DE MATERIAL TIPO "C" CON LA MAQUINARIA ADECUADA PARA ALCANZAR LOS NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE DESALDO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA - MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.								
	C-1			45.00	3.00	0.20		1	27.0000	
	C-4			35.60	4.00	0.20		1	28.0000	
	C-5			120.00	4.00	0.20		1	96.0000	
	C-6			190.00	3.50	0.20		1	133.0000	
								Total Frente	284.0000	M3
								Total Concepto	284.0000	M3
								SCORTEC		
	Fronte	FORMACION DE TERRAZAS EN UNA SOLA CAPA CUBIERTO AL 90 % - INCL. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE CORRES Y ACUMPLIANDOS CON MATERIAL DE BANCO CONTRACTABLE DE 0º A 2º TENDIDO CON MEDIOS MECANICOS, Y AFINADO HASTA ALCANZAR LOS NIVELES DE PROYECTO - CONTRACTADO AL 90% RECONFERABLE SEGUN EL MATERIAL UTILIZADO								
	C-1			87.50	4.50			1	438.7500	
	C-4			74.50	4.50			1	335.2500	
	C-5			159.30	4.50			1	716.8500	
	C-6			271.00	4.50			1	1,219.5000	
								Total Frente	2,710.3500	M2
								Total Concepto	2,710.3500	M2
								SCATEM03		
	Fronte	CONSTRUCCION DE CAVA BASE DE 12 CM DE ESPESOR CONTRACTA (SACABAN) DE 0 A 2º CONFORMADA CON MEDIOS MECANICOS REVUELTA EMSECO, REBORDADA Y TENDIDA CONTRACTA AL 90% A IMPERDAD OPTIMA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL SACABAN, TENDIDO Y CONTACTADO DEL MATERIAL								
	C-1			97.50	4.50			1	438.7500	
	C-4			74.50	4.50			1	335.2500	
	C-5			159.30	4.50			1	716.8500	
	C-6			271.00	4.50			1	1,219.5000	
								Total Frente	2,710.3500	M2
								Total Concepto	2,710.3500	M2

Elaborado: *[Firma]*

BC Y WY SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V.
 C. CARLOS HUGO MENDOZA VITE

ING. FIDELMORO VALENZUELA CANICHE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OXUTZ'AB YUCATÁN.

[Firma]



PRESIDENTE MUNICIPAL
 RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
 OXUTZ'AB YUCATÁN
 EL AYUNTAMIENTO 2018-2021



NÚMEROS GENERADORES

LICITACION: FISMDF-COK-TUC-2019-EP/08
 OBRAS: CONSTRUCCION DE CALLES EN YAXHACHEN

0X01

Exc	Local	Eje	Trazo	Largo	Ancho	Alto	Pesas	Volumen	Observaciones	
3-02	SCARPU1	CONSTRUCCION DE CALLES BORVAS C-1, C-4, FORMACION DE CARPETA CON MEZCLA ASFALTICA (EN FRIO Y GRANULOMETRIA DE 3/8"9), DE APLICAR RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.2 LITRO POR METRO CUADADO DE BOMBIENTO RAPIDO Y MEZCLA ASFALTICA DE 4.0 CM DE ESPESOR COMPACTADO. INCLUYE TENDIDO CON MACEDAMIA FINISIDA Y SE COMPACTARA CON TAMBIEN MODELO LISSO DE 6 A 8 TON, CERRANDO LA CONECTACION CON AFLANDORA DE NEUMATICOS.								
		Fronte								
		C-1		97.50	4.50		1	438.7500		
		C-4		74.50	4.50		1	335.2500		
		C-3		159.30	4.50		1	716.8500		
		C-8		271.00	4.50		1	1,219.5000		
							Total Fronte	2,710.3500	M2	
							Total Concepto	2,710.3500	M2	
		Fronte								
		STAJON61	RIEGO DE TAPONAMIENTO, UTILIZANDO EMULSION ASFALTICA DE BOMBIENTO RAPIDO A RAZON DE 1.50 LITRO POR METRO CUADADO CON AGUA EN UNA PROPORCION DE 10% EMULSION Y 90% DE AGUA, INCLUYE MAQUINARIA PARA SU APLICACION, MANO DE OBRAS Y MATERIALES. (1950)							
		C-1		97.50	4.50		1	438.7500		
		C-4		74.50	4.50		1	335.2500		
		C-3		159.30	4.50		1	716.8500		
		C-8		271.00	4.50		1	1,219.5000		
							Total Fronte	2,710.3500	M2	
							Total Concepto	2,710.3500	M2	

Elaboró 

BO Y RV SEPARACION MULTIPLES S.A. DE C.V.

C. CARLOS HERRERA VITE

ING. FIDELBERTO VARELA CANESE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
 OXUTZ'AB, YUCATAN.



PRESIDENTE MUNICIPAL
 PALLANTONIO ROMERO CHEL
 OXUTZ'AB, YUCATAN
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

OPERADO FISM

OX01

LICITACION: FIMDF-00K-YUC-2019-LP/DB

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES EN YAXHACHEN

NÚMEROS GENERADORES

Ext	Lugar	Eje	Tramo	Largo	Ancho	Altur	Peso	Piezas	Volumen	Observaciones
1-01		REABILITACION DE CALLES C-2, C-3								
		TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO, TOPOGRAFIA, Y COMPIERA INICIAL, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.								
		Finca		135.70	5.00			1	678.5000	
		C-2		79.80	5.00			1	399.0000	
							Total Frente		1,077.5000	M2
							Total Concepto	5PUEBLLI	1,077.5000	M2
		DESCRIPCIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE EN MAL ESTADO, SE NASTA 3 CMS DE ESTEJOS PROVEDIO, INCLUYE ACABELLORADO DEL MATERIAL.								
		Finca		135.70	5.00			1	678.5000	
		C-3		79.80	5.00			1	399.0000	
							Total Frente		1,077.5000	M2
							Total Concepto	5BICANZA	1,077.5000	M2
		CONSTRUCCION DE CARPA BASE DE 11 CMS DE ESPESOR COMPLETO (SALICAB) DE 0 A 20 CONFORMADA CON MEDIDAS MECANICOS REVUELTA ENSECO, HEMBRICIDA Y TENDIDA COMPACTADA AL 90% A REMESA OPTIMA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL SARCAB , TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL								
		Finca		135.70	5.00			1	678.5000	
		C-1		79.80	5.00			1	399.0000	
							Total Frente		1,077.5000	M2
							Total Concepto	5CAPABAS	1,077.5000	M2

Elaboró 

SC Y MY SUPPLIERS MULTIPLES S.A. DE C.V.
C. CARLOS ROGO HOMBRES VITES

ING. FULBERTO GARCÉS CANCHE



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OXTECEN, YUCATAN.



PRESIDENTE MUNICIPAL
PAUL ANTONIO POMERO CHEL
OXTECEN, YUCATAN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

OPERADO FISM

REPORTE FOTOGRAFICO

ESTIMACION No. 1 (UNO)

CONTRATO: FISMDF-OXK-YUC-2019-LP/08

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES EN YAXHACHEN

LOCALIDAD: YAXHACHEN

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2019



PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZ'OH YUCATANI
M. AYUNTAMIENTO 2018-2021

DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE

hoja 1 de 2

ADMINISTRADOR UNICO

C. CARLOS HUGO MENENDEZ VITE

C. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL

OPERADO FISM

REPORTE FOTOGRAFICO

ESTIMACION No. 1 (UNO)

CONTRATO: FISMDF-OXK-YUC-2019-LP/08

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES EN YAXHACHEN

LOCALIDAD: YAXHACHEN

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2019



PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
PAUL ANTONIO ROMERO CHEL
CAKUTZCAB, YUCATÁN
EL AYUNTAMIENTO 2018-2021

DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE

hoja 2 de 2

ADMINISTRADOR UNICO

C. CARLOS HUGO MENENDEZ VITE

C. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL

OPERADO FISM
