



LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA
SOCL610702DR6

57 X 24 Y 26 N° Ext.145-B Col.CENTRO
CP.97970,TEKAX,YUCATAN,México
Régimen fiscal:
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: 853
Lugar de expedición: 97970
Fecha comprobante: 2020-08-27T08:30:27
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN
RFC: MOY8501019K3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL N° Ext.S/N CP.97880, OXKUTZCAB, YUCATAN, MEXICO

Uso de CFDI: G03 - Gestos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de pago: PJE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
72141104	1	E48 - Unidad de	RECIBI DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN LA CANTIDAD \$ 952,683.81 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.) POR PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 DE LOS TRABAJOS DE OBRA "REHABILITACION DE CALLES EN OXKUTZCAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL, SEGUN CONTRATO No. FISMDF-MOY-DOP-2020/04, IMPORTE DE LA ESTIMACION No. 1 \$ 1'173,255.03 (-) AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO -\$ 361,975.76 SUBTOTAL \$ 821,279.15 IMPUESTO LV.A. \$ 131,404.66 TOTAL NETO \$ 952,683.81	821,279.15	821,279.15

Subtotal	821,279.15
Amortizacion	0.00
IVA (16) %	131,404.66
Total	952,683.81

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2020-08-27T08:43:06

Folio fiscal: 7881E931-4276-4D24-683A-2A0010ABE15

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000408523898

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501965426

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.



Emiso por **FACTUR@**
Papé de México S.A. de C.V.

OPERADO FISM

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]T01E3D1-476-4024-863A-2A0D019ABE1E2020-66-2770E42D8[TSR0ST24QW]JVG3UQgkMkgMfCLjW8Pv0z8V78E3eR82YDed
c0DxcE.ggtdn6V5n75DvPwupR6UfmgwdaAdMw6ZwGDF45TRx1r18zUT+acChY87vC8P8vOUyA8E2L3-L54RMy.3b1vRE3vva5uJf
Ded0w83u6Z75C14D9y8Dy+ac15V1vz+JwG9dCQ3vPRuWw8WRWwBQ9ep8hQZBUpmcXZ5D8WQvPyaRQyQyH9g4DUX8M13j8yvk1ZT
Y0a8uPCkMfY7TzCvJ2Fv85Gv8U720M2Yeq4+QZJ8wGRM0vQ+]](8001600000196048)]

Sello Digital del Emisor:

Zf0G3UQgkMkgMfCLjW8Pv0z8V78E3eR82YDed0w83u6Z75C14D9y8Dy+ac15V1vz+JwG9dCQ3vPRuWw8WRWwBQ9ep8hQZBUpmcXZ5D8WQvPyaRQyQyH9g4DUX8M13j8yvk1ZTY0a8uPCkMfY7TzCvJ2Fv85Gv8U720M2Yeq4+QZJ8wGRM0vQ+

Sello digital del SAT:

Zf0G3UQgkMkgMfCLjW8Pv0z8V78E3eR82YDed0w83u6Z75C14D9y8Dy+ac15V1vz+JwG9dCQ3vPRuWw8WRWwBQ9ep8hQZBUpmcXZ5D8WQvPyaRQyQyH9g4DUX8M13j8yvk1ZTY0a8uPCkMfY7TzCvJ2Fv85Gv8U720M2Yeq4+QZJ8wGRM0vQ+



[Handwritten signature]

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FISCALIZACIÓN
M. A. J. GONZÁLEZ GARCÍA

Emisión por FACTUR@
Papeles de México S. A. de C. V.

OPERADO FISM.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfi:Comprobante
Sello="JNG3JLK0g8dN8gMECLyW6SKw3aRIVT5E1zKB2XGalewDboELggb9mbMEs75DuPsewpA1h0JEangw6aAc0ULdW6ZwG1F45TRs1r1faUT+soC3YfI
xmlns:si="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:si="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
LugarEmission="97970" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="952683.81" Moneda="MXN" SubTotal="821279.15"
Certificado="M1GFTCCA/2gAwIBAgIUMDAwMEAwMDAwMDg1MjM4OTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQ0DC9BLMAlGRhC
NoCertificado="00001000000408523898" FormalPago="03" Fecha="2020-08-27T08:30:27" Folio="953" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA" Rfc="SOCL610702DR6"/>
  <cfi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN" Rfc="MOY8801019KJ" UsoCFDI="G03"/>
  <cfi:Conceptos>
    <cfi:Concepto Importe="821279.15" ValorInferior="821279.15" Descripcion="RECIBI DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN LA CANTIDAD
    $ 952,683.81 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.) POR PAGO DE LA ESTIMACION
    No. 1 DE LOS TRABAJOS DE OBRA "REHABILITACION DE CALLES EN OXKUTZCAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL, SEGUN
    CONTRATO No. FISMDF-MOY-DOP-2020/04. IMPORTE DE LA ESTIMACION No. 1 $ 1'173,255.93 (-) AMORTIZACION DEL 30% DEL
    ANTICIPO -$ 351,975.78 SUBTOTAL $ 821,279.15 IMPUESTO L.V.A. $ 131,404.66 TOTAL NETO $ 952,683.81" Unidad="SERVICIO"
    ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" NoIdentificacion="47" ClaveProdServ="72141104">
      <cfi:Impuestos>
        <cfi:Traslados>
          <cfi:Traslado Importe="131404.664" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="821279.15"/>
          <cfi:Traslado>
            <cfi:Impuestos>
              <cfi:Concepto>
                <cfi:Concepto>
                  <cfi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="131404.66">
                    <cfi:Traslados>
                      <cfi:Traslado Importe="131404.66" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                    <cfi:Traslados>
                      <cfi:Impuestos>
                        <cfi:Complemento>
                          <cfi:TimbreFiscalDigital xmlns:si="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
                          xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
                          http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
                          SelloSAT="ZP0GrecCzrop3t3ROAE+0eV8HPXoWc3ExGjY5+dZMIDGEl+gy38uQ+PoQif+evi+8eUHH0GAAT9q6maAHbUcQbWdWz0TlekGgo
                          NoCertificadoSAT="00001000000501960426"
                          SelloCFDI="JNG3JLK0g8dN8gMECLyW6SKw3aRIVT5E1zKB2XGalewDboELggb9mbMEs75DuPsewpA1h0JEangw6aAc0ULdW6ZwG1F45TRs1
                          FechaTimbrado="2020-08-27T08:43:06" UUID="TB81E931-4276-4D24-883A-2A9DD10ABE15" RfcProvCertif="TSP080724QW6"/>
                        <cfi:Complemento>
                          <cfi:Comprobante>

```

OPERADO FISM

C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA

CALLE 57 No. 145-B X 24 Y 26 COLONIA YOCCHENUX, TEEKAX, YUCATAN

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

ESTIMACION No. 1 01

HOJA : 1 DE : 1

CONTRATISTA : S&K CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DEPARTAMENTO :

PERIODO DEL : 29-Jul-2020 AL : 15-ago-2020
 CONTRATO No. : FISMOS-MOY-DOP-2020/04
 LOCALIDAD : XUL
 MUNICIPIO : OXKUTECAH
 MONTO CONTRATADO : \$ 3,567,843.09

INVENTE DE ESTIMACION : \$ 1,173,255.93
 OBRA : OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OXKUTECAH,
 FECHA INICIACION: 29/07/2020, : ACCESO FUNDACION
 FECHA TERMINACION: 15/08/2020
 ANTICIPO : \$ 1,026,165.50

CLAVE	CONCEPTO	HIGHTH CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE ESTIMACION	SALDO X ESTIMAR	INDICADORES
801	CONSTRUCCION	3,420,532.66	0.00	0.00	0.00	3,420,532.66	I.C.I.C. \$ 0.00 OTRAS 0.000 TOTAL 0.000
IMP. ESTIMACION: \$ 1,173,255.93 ANTICIPO: \$ 1,026,165.50 SUBTOTAL: \$ 211,370.12 IVA: \$ 331,404.66 IMPORTE BRUTO: \$ 542,774.78 REDUCCION: \$ 0.00 IMPORTE NETO: \$ 542,774.78							
T O T A L E S		3,420,532.66	0.00	0.00	0.00	3,420,532.66	

\$ 952,683.81

IMPORTE LETRAS : (CON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.-)



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
 OXKUTECAH, YUCATAN
 A. AYUNTAMIENTO 2016-2021

[Signature]

Elaboré:

[Signature]

ING. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OPERADO FISM

C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA
CONTROL FINANCIERO

CONTRATO FISMDF-MOT-DOP-2020/04

ESTIMACIÓN: 01

OBRA: REABILITACION DE CALLES EN OXUTZUCAB, LOCALIDAD DE NUL. ACCESO PRINCIPAL. FECHA DE ESTIMACION : 15-ago-2020
CONTRATO No. FISMDF-MOT-DOP-2020/04.

LOCALIDAD : NUL

PERIODO : 19-jul-2020 AL : 15-ago-2020

MUNICIPIO : OXUTZUCAB

CONTRATISTA JC. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA

I M P O R T E S	L I Q U I D A C I O N (\$)	
VALOR DE LA ESTIMACIÓN	\$1,173,255.93	
30.00% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$351,976.78	
SUBTOTAL	\$821,279.15	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$131,404.66	
SUBTOTAL DEL VALOR DE LA ESTIMACIÓN	\$952,683.81	
RETENCIONES :		
3.00% I.C.I.C.:	\$0.00	
0.00% DERECHO Y SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL:	\$0.00	
0.00% OBRAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL:	\$0.00	
SUBTOTAL RETENCIONES :	\$0.00	
ALCANJE LIQUIDO DE LA ESTIMACIÓN	\$952,683.81	

A N T I C I P O	S/IVA	C/IVA
IMPORTE ANTICIPO	\$1,026,163.90	\$1,374,352.33
AMORTIZACIÓN ACUMULADO ANTERIOR	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$351,976.78	\$468,293.06
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$351,976.78	\$468,293.06
SALDO POR AMORTIZAR	\$674,187.12	\$882,059.27

ESTADO DE CUENTA + CONVENIO	S/IVA	C/IVA
IMPORTE ACTUAL CONTRATADO	\$2,420,552.46	\$3,167,841.09
ACUMULADO ANTERIOR	\$0.00	\$0.00
ESTA ESTIMACIÓN	\$1,173,255.93	\$1,368,375.88
ACUMULADO A LA FECHA	\$1,173,255.93	\$1,368,375.88
SALDO POR EJERCER	\$1,247,296.53	\$1,606,964.21



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAÚL ANTONIO ROMERO OHEL
OXUTZUCAB, YUCATÁN
EL AYUNTAMIENTO 2016-2021

C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA
CALLE 57 No. 145-B X 24 Y 26 COLONIA YOCCHENKAX, TEKAX, YUCATAN

ESTADO DE CUENTA HASTA LA ESTIMACIÓN NO. 01

PROGRAMA :	RAMO 33	CONTRATISTA :	86K CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
LOCALIDAD :	KUL	CONTRATO :	FISMDF-MOY-009-2020/04
MUNICIPIO :	OXKUTZCAB	FECHA :	28-jul-2020
		FECHA DE INICIO :	29-jul-2020
		TERMINACIÓN :	11-oct-2020
OBRA :	OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OXKUTZCAB, LOCALIDAD DE XOL, ACCESO PRINCIPAL. CONTRATO No. FISMDF-MOY-009-2020/04.		
CONT. (I/IVA) :	\$3,420,582.66	AMPLIACIÓN :	\$0.00
		ANTICIPO :	\$1,026,165.00

ESTADO DE CUENTA
HASTA LA ESTIMACIÓN NO. 01
FECHA : 13-ago-2020

IMPORTE DEL CONTRATO :	\$3,420,582.66
IMPORTE DE ESTIMACIONES ANTERIORES :	\$0.00
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN :	\$1,172,355.93
SALDO	\$2,247,226.73
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO :	
IMPORTE DEL ANTICIPO :	\$1,026,165.00
AMORTIZADO ESTIMACIONES ANTERIORES :	\$0.00
AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN :	\$351,976.78
SALDO	\$674,188.02

ADSCRIPCIÓN

C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA

AUTORIZÓ

ING. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATAN
II. AJUNTAMIENTO 2018-2021**

Vo. Bo.

ING. FELIXBERNARDO VARGUES CANCEN
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

OPERADO FISM

ESTIMACIÓN

C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA
CALLE 57 No. 145-B X 24 Y 26 COLONIA VOCCHERMAX, TEXAX, YUCATÁN

FECHA 8 DE 2

SOLICITACIÓN No.:	01	FECHA:	15-ago-2020	HET.:	29-Jul-2020	AL:	15-ago-2020	IMPORTE:	1,350,874.88
PROGRAMA:	PAMO 2)								
LOCALIDAD:	MUNICIPIO DE OXTEPEQUE								
CONTRATO:	CONTRATO N.º FISCOP-MOT-008-2020/24								
FECHA DE INICIO:	29-01-2020								
FECHA DE TERMINACIÓN:	31-01-2020								

CLAVE	CONCEPTO	PTE	UNI	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	VOLUMEN		IMPORTE ESTIMADO
							PRESENTE	EXCEDENTE	
001	CONSTRUCCION FORMACION DE CARRILES DE CONCRETO AUTALICADO EN CALIENTE, UTILIZANDO MATERIALES DE 3/8" A FIBRAS Y 4 CM. DE ESPESOR. CONTACTO SE AFICADA BANDA DE LIGA A RASO DE 1.00 LT/M2 CON EMULSION SUPERESTABLE ALEMANA AL 8% EN EMULSION - 20% AGUA CURRIMOSSE CON UNA CADA INCLUSION EN FIBRO DE 3/8" APLICADO DE FORMA MANUAL (PORCE) CON TRAVINENTADORA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON RODILLO LISO CONTINUANDO EL PROCESO CON RODILLO DE NEUMATICOS (DE FORMA ALTERNADA) LINDRICA FIRMA, DESALZO DEL MATERIA EXCEDENTE O NO UTILIZABLE DESDE REALIZAN EN TODA EL AREA Y DESALZAN TODO EL MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA MESA.		MC	262.35	8,590.50	0.00	431.00	0.00	112,153.05
51251	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA HORIZONTAL DE 1.20M. DE ANCHO Y 0.30M. DE ALTURA A UNO DE LATERA C. 22, INSTALADO EN MANTONER DE 2.00 M. DE ALTURA A NIVEL DE TERRENO NATURAL, HECHO A BASE DE FIB DE 1.5" GARANTIZADO, IMPRESO DIGITAL A COLOR NITIDO, DE ACUERDO AL MODELO PROPORCIONADO POR EL MUNICIPIO.		PEA	5,028.66	1.00	0.00	1.00	0.00	5,028.66
	REVISAR		MC	27.26	8,090.50	0.60	8,990.50	0.00	245,980.08

Elaboró  **RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL**
 COMISARIO DE OBRAS PUBLICAS
 MUNICIPIO DE OXTEPEQUE
 C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 MUNICIPIO DE OXTEPEQUE

OPERADO FISM

ESTIMACIÓN

C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA
CALLE 57 No. 145-B X 24 Y 26 COLONIA YOCCHEREAAX, TERAAX, YUCATAN

HUJA 2 DE 2

Estimación No. : 21	FECHA : 15-ago-2020	HEC. : 24-jul-2020	AL : 15-ago-2020	IMPORTE : 1,350,976.88
PROGRAMA Y REND 33	CONTRATISTA : SAK CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.			
LOCALIDAD : 001	CONTRATO : FISMUP-MOY-DCP-2620/04			
CEBA : OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN ORDEN, LOCALIDAD DE RIN. ACCEDI	FECHA DE INICIO : 29-jul-2020			
ESTIMACIONAL	TERMINACION : 11-oct-2025			
CONTRATO No. FISMUP-MOY-DCP-2620/04.				

CLAVE	CONCEPTO	FTE	USI	PRECIO UNITARIO	VOLUMEN		IMPORTE ESTIMADO
					PREPROVEISTO	ACTUAL. INT.	
50002	CORTE MI MATERIAL TIPO "C" CON MANO DE OBRERA ADECUADA, INCLUYERÁ ACARRO DEL MATERIAL, PRODUCTO DEL CORTE AL LUGAR DONDE INICIE EL MUNICIPIO HASTA 8 KM. DE DISTANCIA. FORMACION DE LA BASE HIDRAULICA DE 12 CM. DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAS DE BASCO GRADUADO DE 0" A 2", TENDIDO Y VENTILADO AL 5%, INC: MANO DE OBRERA Y MATERIAS GRADUADOS EN EL SITIO DE TRABAJO, PUEBLOS DE CALIDAD PARA EL CONFINO DE CALIDAD EFICIENTE Y SUPERFICIE POR CADA 100.00 MTS. ES. M2/M.		M2	659.92	44.22	0.00	29,160.86
			M2	80.26	8,998.50	0.00	721,277.52
TOTAL CONSTRUCCION							750,438.38
					SUBTOTAL		1,171,715.90
					16.00 % IVA		187,220.95
					TOTAL ESTIMACION		1,358,936.85



PRESIDENTE MUNICIPAL
BAUL ANTONIO ROMERO CHEL
CIUDAD DE YUCATAN

ANEXO 10
 FIRMA:
 ELABORADO:
 INS. FILITREMONTÉ VALDERRAMA CHACÓN
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISADO:
 INS. FILITREMONTÉ VALDERRAMA CHACÓN
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OPERADO FISM

NÚMEROS GENERADORES

DIRA: REHABILITACION DE CALLES EN OKNUTZCAR, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL,
 CONTRATO No. FISMOP-MOY-DOF-2020/04.

Período 1 DEL 25/03/2020 AL 31/ago/2020

Ext	Lugar	Eje	Tramo	Largo	Ancho	Alto	Peso	Pases	Volumen	Observaciones
001		CONSTRUCCION								
	PRELIMINARIO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA INFERIOR DE 1.20M. DE ANCHO Y 0.90M. DE ALTURA A BASE DE LAMINA C. 22, INSTALADO EN BASTIDOR DE 2.00 M. DE ASTURA A NIVEL DE TERRENO NATURAL, HECHO A BASE DE PFR DE 1.2" GALVANIZADO, IMPRESO DIGITAL A COLOR KITIDO, DE ACCESO AL MODELO PROPORCIONADO POR EL MUNICIPIO.									
01	Frente							1	1.0000	
								Total Frente	1.0000	PZA
								Total Concepto	1.0000	PZA



PRESIDENTE MUNICIPAL
 DON ANTONIO ROMERO CHEL
 CUATECAB, YUCATAN
 N. REGISTRO 3114-351

OPERADO FISM

C. LOIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA
 CALLE 57 No. 145-B X 24 Y 26 COLOBIA YOCCHENKAK, TIZIMAN, YUCATÁN.

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OXNUTICAR, LOCALIDAD DE XUT, ACCESO PRINCIPAL.
 CONTRATO No. FLSMDF-MOY-DOP-2020/04.

Periodo : DEL 29/01/2020 AL 15/04/2020

Est	Lugar	Tip	Tramo	Longo	Ancho	Alto	Preso	Unidad	Volumen	Observaciones
033	CONSTRUCCION									
ALFEBREA FINAL, SEGUNDO DESMOLZADO DE MATERIAL EXCEDENTE O NO UTILIZABLE ANTES DE ENTERRAR LA CORA, SE DEBERA REALIZAR EN TODA EL AREA Y DESMOLZAR TODO EL MATERIAL SOBREPANTE FUERA DE LA RISSA.										
Fronte										
01	CALLE	10	9-7	214.50	3.00			1	1,022.5000	
01		10	3-7	283.50	3.00			1	1,307.5000	
01			3-7	85.20	3.00			1	431.0100	
01			3-5	106.50	3.00			1	532.5100	
01		5	11-8	245.00	4.50			1	1,107.5000	
01			8-6	80.00	3.00			1	240.0000	
01		11	6-13	157.80	3.00			1	789.0000	
01		11	6-8	143.5	3.00			1	717.5000	
01		12	11-13	170.00	3.00			1	540.0100	
01		14	13-11	70.00	3.00			1	350.0100	
01			11-9	142.80	3.00			1	710.0100	
01			9-7	225.00	4.50			1	1,012.5000	
Total Fronte										
Total Concepto									5176000	
									8,990,5000	ME
									8,990,5000	ME



PRESIDENTE MUNICIPAL
 RAÚL ANTONIO ROMERO OJEL
 CUANTUCAS YUCATÁN
 M. AYUTMAYECAN

OPERADO FISM

CALLE 57 No. 145-B X 24 Y 26 COLONIA YOCCHERKAX, TETAX, YUCATAN.

NÚMEROS GENERADORES

OX15 OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OXKUTYKAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL.
 CONTRATO No. FISMIE-MDY-DOP-2020/04.

Periodo : DEL 28/01/2020 AL 25/06/2020

Est.	Lugar	Eje	Tramo	Largo	Ancho	Alto	Peso	Piezas	Volumen	Observaciones
001	SC0002	CONSTRUCCION								
		CURBS EN MATERIAL TIPO "C" CON MACQUINERIA MEDIANA, INCLUYE: ALIENADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL LOMAR DONDE INDIQUE EL MUNICIPIO HASTA 1 KM. 58 DISTANCIA.								
		Fronte								
01	CALLE 17	1-9		18.70	1.50	0.30		1	18.8300	
01		3-3		11.00	1.40	1.10		1	17.2400	
01		3-3		18.45	1.20	0.35		1	17.8100	
								Total Fronte	46.2100	M3
								Total Concepto	500002	M3



PRESIDENTE MUNICIPAL
 RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
 OXKUTZCAB, YUCATAN
 EL ATUNAMIENTO 2014-2017

\$

OPERADO FISM

C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA
 CALLE 57 No. 145-B X 24 Y 26 COLOMIA TUCCHENKAS, TIZIMAN, YUCATAN.

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OKUUTZ'AB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL,
 CONTRATO No. FISDEF-MOY-DOE-2020/04.

Fecha: 18/07/2025 AL 15/ago/2025

Est	Lugar	Eje	Tramo	Largo	Ancho	Alt	Vol	Pisos	Vol	Observaciones
001	CONSTRUCCION									
001	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: BRILADO DEL EQUIPAMIENTO DE LA MESA FUERA DEL AREA DE LA OBRA. M2									
Frants										
01		10	3-7	209.40	3.50			1	1,022.0000	
01	CALLE	10	5-7	281.50	5.00			1	1,407.5000	
01			5-3	66.20	5.00			1	431.0000	
01			3-1	144.50	5.00			1	832.5000	
01			14-3	285.00	4.50			1	1,282.5000	
01			4-4	89.00	3.00			1	240.0000	
01			6-10	353.00	5.00			1	165.0000	
01			6-8	343.6	5.00			1	117.5000	
01			11-13	109.00	5.00			1	600.0000	
01			13-11	95.00	5.00			1	350.0000	
01			11-9	142.00	5.00			1	113.0000	
01			6-7	225.00	4.50			1	1,012.5000	
Total Frants									8,990.0000	M2
Total Concepto									8,990.0000	M2



PRESIDENTE MUNICIPAL
 RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
 OCUUTZ'AB YUCATAN
 AYUNTAMIENTO 2024-2027

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

OPERADO FISM

C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA
 CALLE 57 No. 1458-B X 24 Y 26 COLONIA YOCCHENKAY, IZAMAL,
 YUCATAN.

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OXNUTECAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL,
 CONTRATO No. FISMDF-NOY-DOP-2020/04.

Periodo : DEL 23/JUL/2020 AL 15/AGO/2020

Col	Lugar	Uso	Tramo	Inicio	Fin	Alto	Peso	Pistas	Volumen	Observaciones
001	CONSTRUCCION									
001	FORMACION DE LA OBRERA BARRANQUILLA DE 12 CM. DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE SACO GRUESO DE 5" A 2", TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%, 20C; SACOIMARIA, MAMO DE OBRERA Y MATERIALES DEPOSITADOS EN EL SITIO DE TRABAJO, PRECISAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EFECTUANDO 3 SERIEOS POR CADA 100.00 MTS DE L/983.									
01		10	3-7	294.40	3.00			1	1,022.0500	
01	CALLES	10	3-7	261.50	3.70			1	1,307.5500	
01		5-7	46.20	1.70				1	431.0000	
01		2-1	166.50	2.00				1	833.0000	
01		10-4	243.00	4.50				1	1,103.5000	
01		6-8	40.00	3.00				1	210.0000	
01		8-20	133.00	3.00				1	165.0000	
01		4-8	147.5	3.00				1	217.3000	
01		11-13	500.00	3.00				1	500.0000	
01		13-11	70.00	3.00				1	350.0000	
01		11-9	147.00	3.00				1	710.0000	
01		3-7	225.00	4.50				1	1,012.5000	
Total Frente								Sumario		
Total Concepto								Sumario		



PRESIDENTE MUNICIPAL
 RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 EL ATUNAMIENTO, YUCATÁN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OPERADO FISM

CALLE 57 No. 145-B X 24 Y 26 COLONIA TUCCHENKAY, TETAX, YUCATAN.

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OKNUTECAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL.
 CONTRATO No. FLSHEP-MOY-DOF-2020/04.

Fecha: 08/05/2025 AL 15/ago/2025

Ord.	Ubicac	Objeto	Tramo	Largo	Ancho	Alto	Peso	Pistas	Volumen	Observaciones
001		CONSTRUCCION SCAPOS								
		FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALZONES, UTILIZANDO MATERIALES DE 3/8" A FINOS Y 4 CM. DE ESPESOR COMPACTO. SE APLICARA RIEGO DE 2.5 KG A BACHO DE 1.40 LT/M2 CON ENCELACION SUPERESTABLE RESANADA AL 10% (99% EMULSION - 10% AGUA) CUBRIENDOSE CON UNA CAPA EMULSIONADA EN FRIO DE 3/8" APLICADO DE FORMA MANUAL (PORRICO). DESPUES LA APLICACION DEBERA SER CON PAVIMENTADORA (FINISHES) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON RODILLO LISO CONTINUANDO EL PROCESO CON RODILLO DE NEUMATICOS (SE FORMA ALTERNAN)								
01		Fronte	5-3	86.70	5.00			1	431.0000	
							Total Frente		431.0000	M2
							Total Concepto	500/05	431.0000	M2



PRESIDENTE MUNICIPAL
 RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
 OXUCABAL, YUCATAN
 H. AYUNTAMIENTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OPERADO FISM



BITACORA DE OBRA



ESTIMACIÓN No. 01

CONTRATO No: FIS MDF-MOY-DOP-2020/04

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OXKUTZCAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL

CONTRATISTA: C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA

<p>NOTA#01 FECHA 29/07/2020</p>	<p>CON ESTA FECHA SE REALIZA LA APERTURA DE LA PRESENTE BITACORA RELATIVA AL CONTRATO No:FIS MDF-MOY-DOP-2020/04 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OXKUTZCAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL, LA CUAL SERÁ SUPERVISADA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB. EL DIERCTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE POR PARTE DE LA CONTRATISTA C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA EL ING. REY DAVID EHUAN AREVALO, SE REALIZA EL REGISTRO DE FIRMAS Y SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES CRITERIOS Y RECOMENDACIONES:</p> <p>1. LA BITÁCORA DE OBRA SERÁ EL MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL SE ASENTARÁ CUALQUIER CAMBIO Y MODIFICACIÓN AL PROYECTO. SE LE RECOMIENDA COLOCAR SUS SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS Y RESTRICTIVAS Y CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE QUE SE PROPORCIONARON ANEXAS AL CONTRATO.</p>
<p>Firma</p>  <p>POR LA EMPRESA CONTRATISTA ING. REY DAVID EHUAN AREVALO</p>	<p>Firma</p>  <p>POR LA SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE</p>

<p>NOTA#02 FECHA 29/07/2020</p>	<p>CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO SE INICIAN LOS TRABAJOS DE ESCARIFICACION DE PAVIMENTO DE HASTA DE 10 CM. DE ESPESOR EN MAL ESTADO EN LAS CALLES 5 X 8 Y 10. SE CUENTA CON LA SIGUIENTE MAQUINARIA EN OBRA MOTOCONFORMADORA, PIPA DE GUA, VIBROCOMPACTADOR, CAMION VOLQUETE DE 7 M3, CAMIONETA PICK UP, SE INICIA EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA.</p>
<p>Firma</p>  <p>POR LA EMPRESA CONTRATISTA ING. REY DAVID EHUAN AREVALO</p>	<p>Firma</p>  <p>POR LA SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE</p>



PRESIDENTE MUNICIPAL
SAUL ANTONIO ROMERO DEL
OXKUTZCAB, YUCATÁN
EL AYUNTAMIENTO 2019-2021

OPERADO FISM

BITACORA DE OBRA



ESTIMACIÓN No. 01

CONTRATO No: FISMDF-MOY-DOP-2020/04

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OXKUTZCAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL

CONTRATISTA: C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA

NOTA#03 FECHA 3/08/2020	CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA SUPERVISION DEL MUNICIPIO SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE ESCARIFICACION DE PAVIMENTOS DE HASTA DE 10 CM. DE ESPESOR EN MAL ESTADO EN LA CALLE 11 X 6 Y 10, CALLE 12 X 11 Y 13, CALLE 14 X 7 Y 13.
FIRMA  POR LA EMPRESA CONTRATISTA ING. REY DAVID EHUAN ARÉVALO	FIRMA  POR LA SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE

NOTA#04 FECHA 10/08/2020	CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA SUPERVISION DEL MUNICIPIO SE INICIAN LOS TRABAJOS DE ESCARIFICACION DE PAVIMENTOS DE HASTA DE 10 CM. DE ESPESOR EN MAL ESTADO EN LA CALLE 10 X 1 Y 9 Y SE INICIAN LOS TRABAJOS DE CORTE EN MATERIAL TIPO "C" CON EQUIPO MECANICO (RETROEXCAVADORA) EN LA CALLE 10 X 3 Y 5 Y CALLE 10 X 7 Y 9 Y SE INICIAN LOS TRABAJOS DE FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CM. DE CON MATERIAL 2" A 0 EN LAS CALLE 5 X 6 Y 10 Y CALLE 11 X 6 Y 10.
FIRMA  POR LA EMPRESA CONTRATISTA ING. REY DAVID EHUAN ARÉVALO	FIRMA  POR LA SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE

NOTA#05 FECHA 15/08/2020	¿CON ESTA FECHA DE NOTIFICA A LA SUPERVISION DEL MUNICIPIO SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CM. DE CON MATERIAL 2" A 0 EN LA CALLE 12 X 11 Y 13, CALLE 14 X 7 Y 13 Y CALLE 10 X 1 Y 9 Y SE INICIAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4 CM. DE ESPESOR EN LA CALLE 10 X 3 Y 5.
--------------------------------	---



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAÚL ANTONIO ROMERO SNEI
OXKUTZCAB, YUCATAN
EL AYUNTAMIENTO 2018-2021

OPERADO FISM



BITACORA DE OBRA

ESTIMACIÓN No. 01

CONTRATO No: FISMDF-MOY-DOP-2020/04

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OXKUTZGAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL

CONTRATISTA: C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA

<p>FIRMA</p>  <p>_____ POR LA EMPRESA CONTRATISTA ING. REY DAVID EHUAN AREVALO</p>	<p>FIRMA</p>  <p>_____ POR LA SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE</p>
---	---



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATÁN
II. AYUNTAMIENTO 2019-2021

Reporte Fotográfico Estimación No. 1

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OXKUTZCAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL
NO. DE CONTRATO: FISMDF-MOY-DOP-2020/04



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATÁN
M. AYUNTAMIENTO 2018-2021

OPERADO FISM

Reporte Fotográfico Estimación No. 1

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OXKUTZCAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL
NO. DE CONTRATO: FISMDF-MOY-DOP-2020/04




PRESIDENTE MUNICIPAL
RAJÁ ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

OPERADO FISM

Reporte Fotográfico Estimación No. 1

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OXKUTZCAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL
NO. DE CONTRATO: FISMDF-MOY-DOP-2020/04




PRESIDENTE MUNICIPAL
RAJAL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATAN
M. AYUCAMBERTO 2016-2021

OPERADO FISM

Reporte Fotográfico Estimación No. 1

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OXKUTZCAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL
NO. DE CONTRATO: FISMDF-MOY-DOP-2020/04



PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATÁN
II. AYUNTAMIENTO 2014-2018

OPERADO FISM

Reporte Fotográfico Estimación No. 1

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OXKUTZCAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL
NO. DE CONTRATO: FISMDF-MOY-DOP-2020/04



PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATÁN
R. AYUNTAMIENTO 2016-2021

OPERADO FISM

Reporte Fotográfico Estimación No. 1

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OXKUTZCAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL
NO. DE CONTRATO: FISMDF-MOY-DOP-2020/04




PRESIDENTE MUNICIPAL
RAJALAMTOBO RINERO CHEL
GOBIERNO MUNICIPAL
OXKUTZCAB YUCATÁN
R. FUNDAMENTO 2016-5024



OPERADO FISM

Reporte Fotográfico Estimación No. 1

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OXXUTZCAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL
NO. DE CONTRATO: FISMDF-MOY-DOP-2020/04

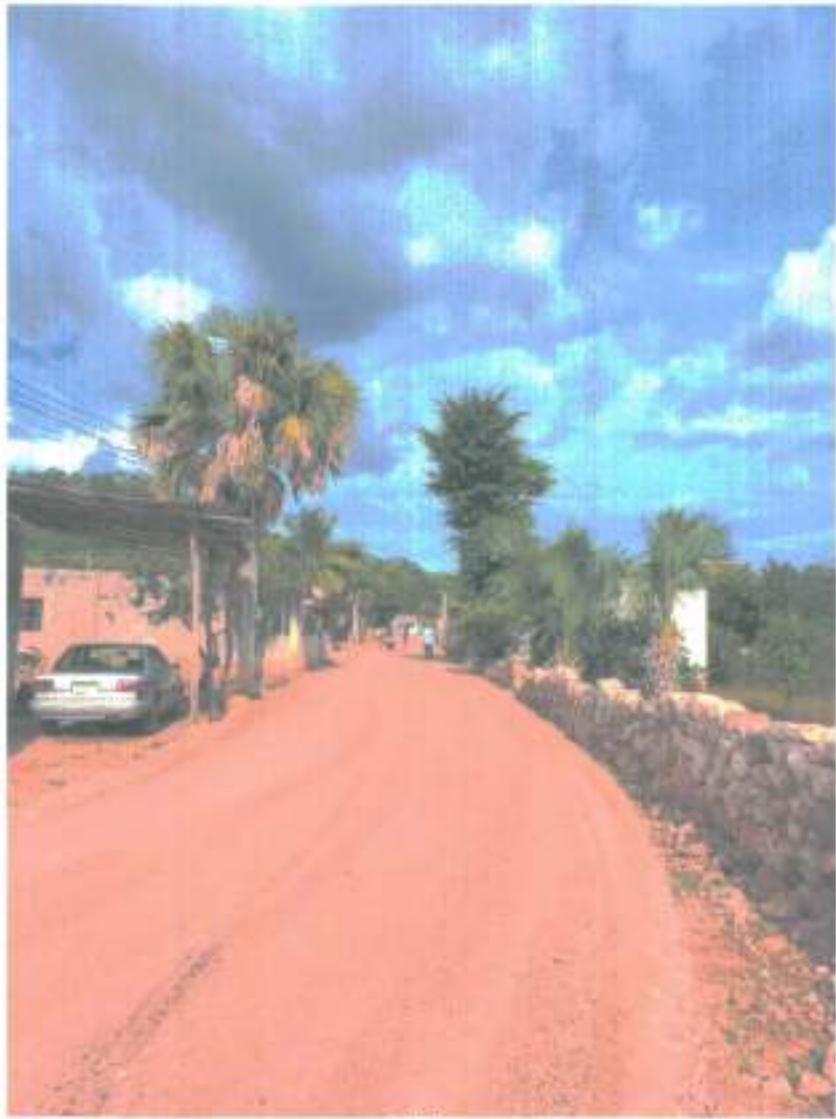

PRESIDENTE MUNICIPAL
RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL
OXXUTZCAB, YUCATÁN
M. AYUNTAMIENTO 3191-3021



OPERADO FISM

Reporte Fotográfico Estimación No. 1

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OXKUTZCAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL
NO. DE CONTRATO: FISMDF-MOY-DOP-2020/04




PRESIDENTE MUNICIPAL
RAÚL ANTONIO PONERO CHE
OXKUTZCAB, YUCATÁN
II. ASESORIA 2019-2020

OPERADO FISM.

Reporte Fotográfico Estimación No. 1

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OXKUTZCAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL
NO. DE CONTRATO: FISMDF-MOY-DOP-2020/04

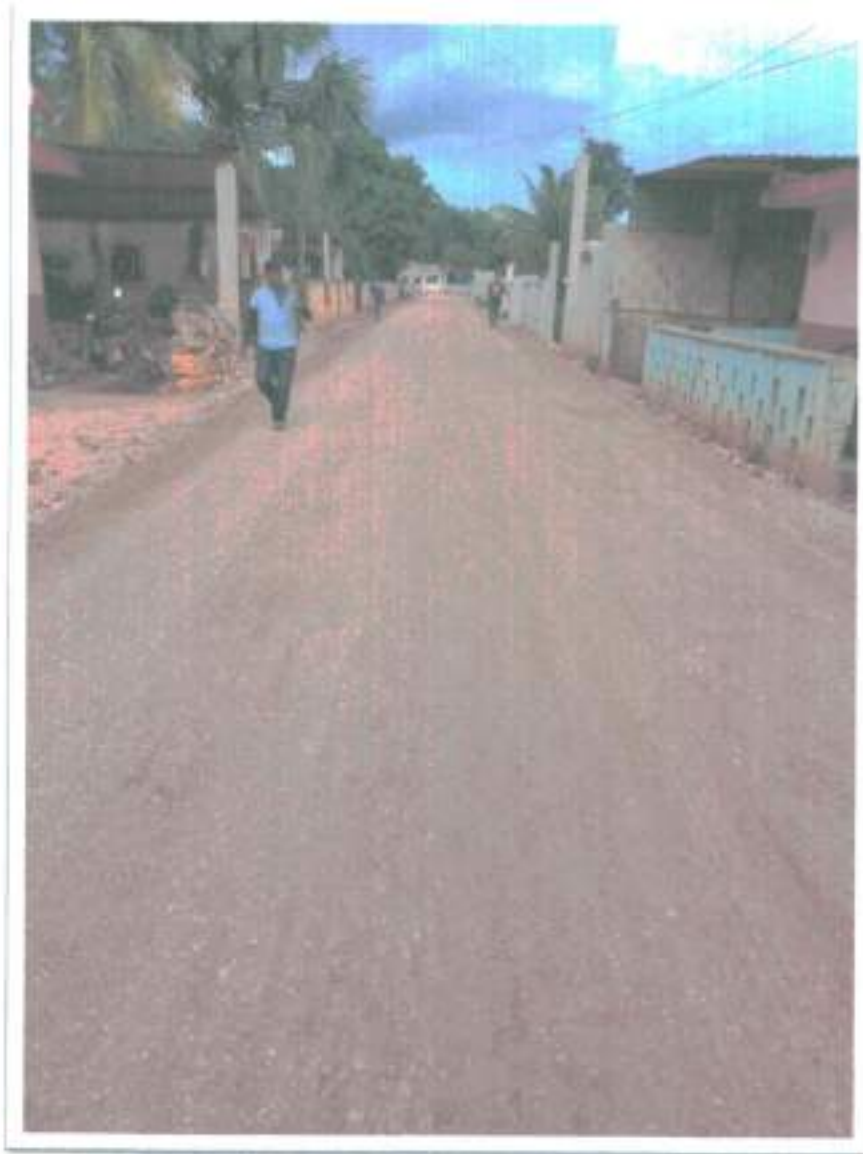

PRESIDENTE MUNICIPAL
RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATÁN
M. AYUNTAMIENTO 2018-2021

OPERADO FISM

Reporte Fotográfico Estimación No. 1

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OXKUTZCAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL
NO. DE CONTRATO: FISMDF-MOY-DOP-2020/04



PRESIDENTE MUNICIPAL
BAJA ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATAN
M. AYUNTAMIENTO 2014-2021

OPERADO FISM

Reporte Fotográfico Estimación No. 1

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OXKUTZCAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL
NO. DE CONTRATO: F/SMDF-MOY-DOP-2020/04



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATÁN
M. AYUNTAMIENTO 2018-2021

OPERADO FISM

H. AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REHABILITACION DE CALLES EN OXKUTZCAB,
LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL

HACIA E. ZAPATA



PRESIDENTE MUNICIPAL
BAIL ANTONIO ROSARIO CHEL
CONCEJAL
M. AYUNTAMIENTO

EST. No. 1

C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA



RECONSTRUCCION DE CALLES

OPERADO FISM
